


令和8年度 川岸学園整備事業 工事等スケジュール概要 (第三期工事の再積算後)

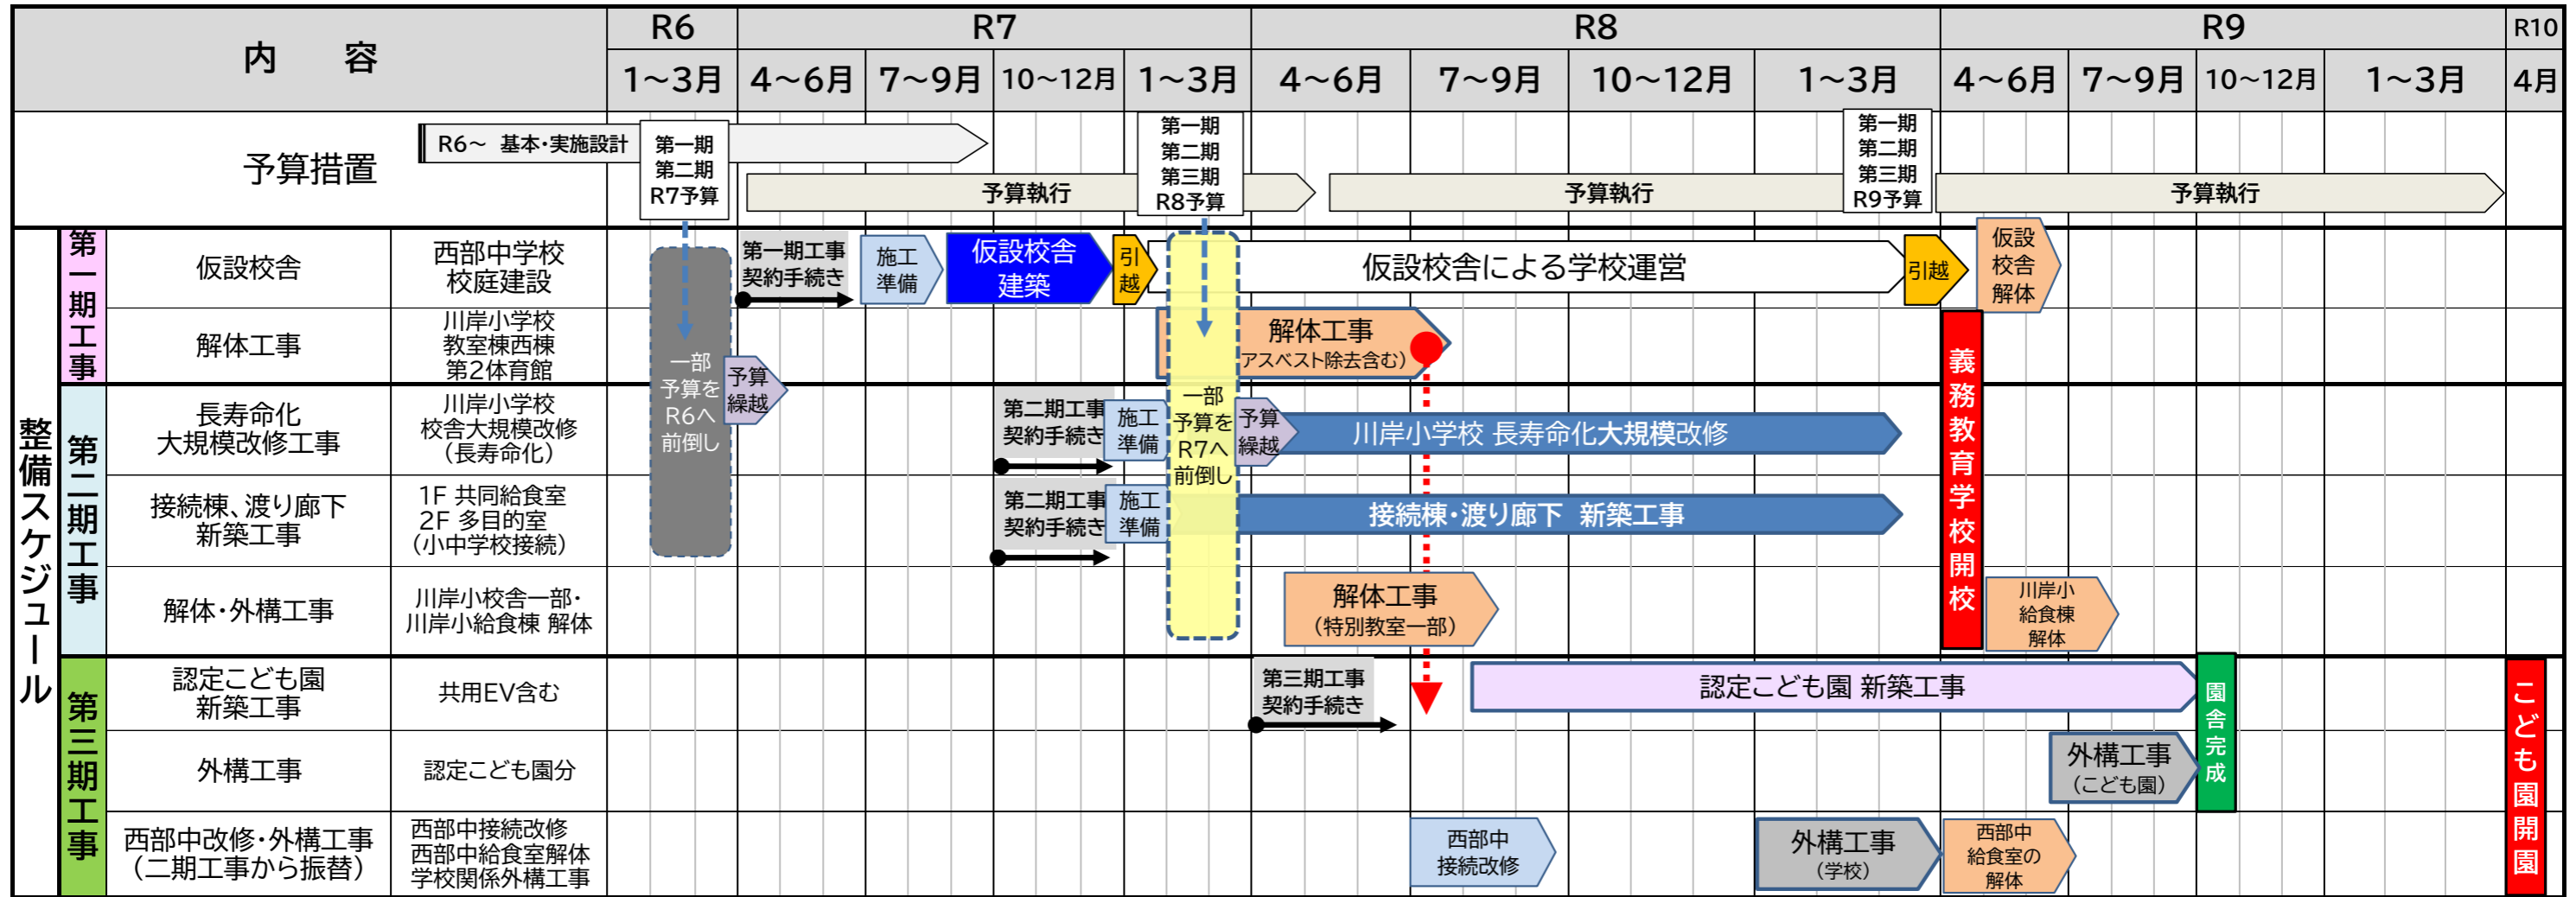

総事業費(第一期工事、第二期工事は契約額・第三期工事は再積算後の設計額)

(単位:千円)

区分	事業費	令和6年度		令和7年度 (R6からの繰越分を含む)		令和8年度			令和9年度	
						R7へ前倒し分	当初分			
工事費	第一期	466,400	※一部事業費についてはR6に前倒して予算化(R7繰越事業)	第一期	236,000	第一期	(183,210)	6,490	第一期	40,700
	第二期	2,828,815		第二期	116,800	第二期	(2,569,025)	26,700	第二期	116,290
	第三期	1,417,700		第三期		第三期		園舎 516,900 学校 68,100	第三期	園舎 773,400 学校 59,300
委託費	208,569	委託費(設計)	99,000	委託費(設計/工事監理)	60,569	委託費(工事監理)	(24,140)	7,930	委託費(工事監理)	16,930
備品購入費	197,190			備品購入費		備品購入費(学校)	(133,090)		備品購入費(こども園)	64,100
建築手数料	2,826			建築手数料	1,917	建築手数料	(358)	92	建築手数料	459
全体事業費(概算)	5,121,500	令和6年度 事業費	99,000	令和7年度 事業費	415,286	令和8年度 事業費	(2,909,823)	626,212	令和9年度 事業費	1,071,179

財源内訳

財源	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
国・県補助金	1,650,078	66,750	(911,467)	392,645
市債	3,256,700	63,800	(1,959,200)	575,800
一般財源	214,722	35,200	(39,156)	102,734

事業費比較(工期別)

区分	実施設計後(R7.11)	再積算後事業費(R7)	比較
第一期工事	466,400	466,400	0
第二期工事	2,833,200	2,828,815	△ 4,385
第三期工事	1,219,000	1,417,700	198,700
委託料・備品・他	439,200	408,585	△ 30,615
合計	4,957,800	5,121,500	163,700

事業費比較(施設別)

区分	実施設計後(R7.11)	再積算後事業費(R7)	比較
学校施設整備	3,749,000	3,725,000	△ 24,000
こども園整備	1,208,800	1,396,500	187,700
合計	4,957,800	5,121,500	163,700
