


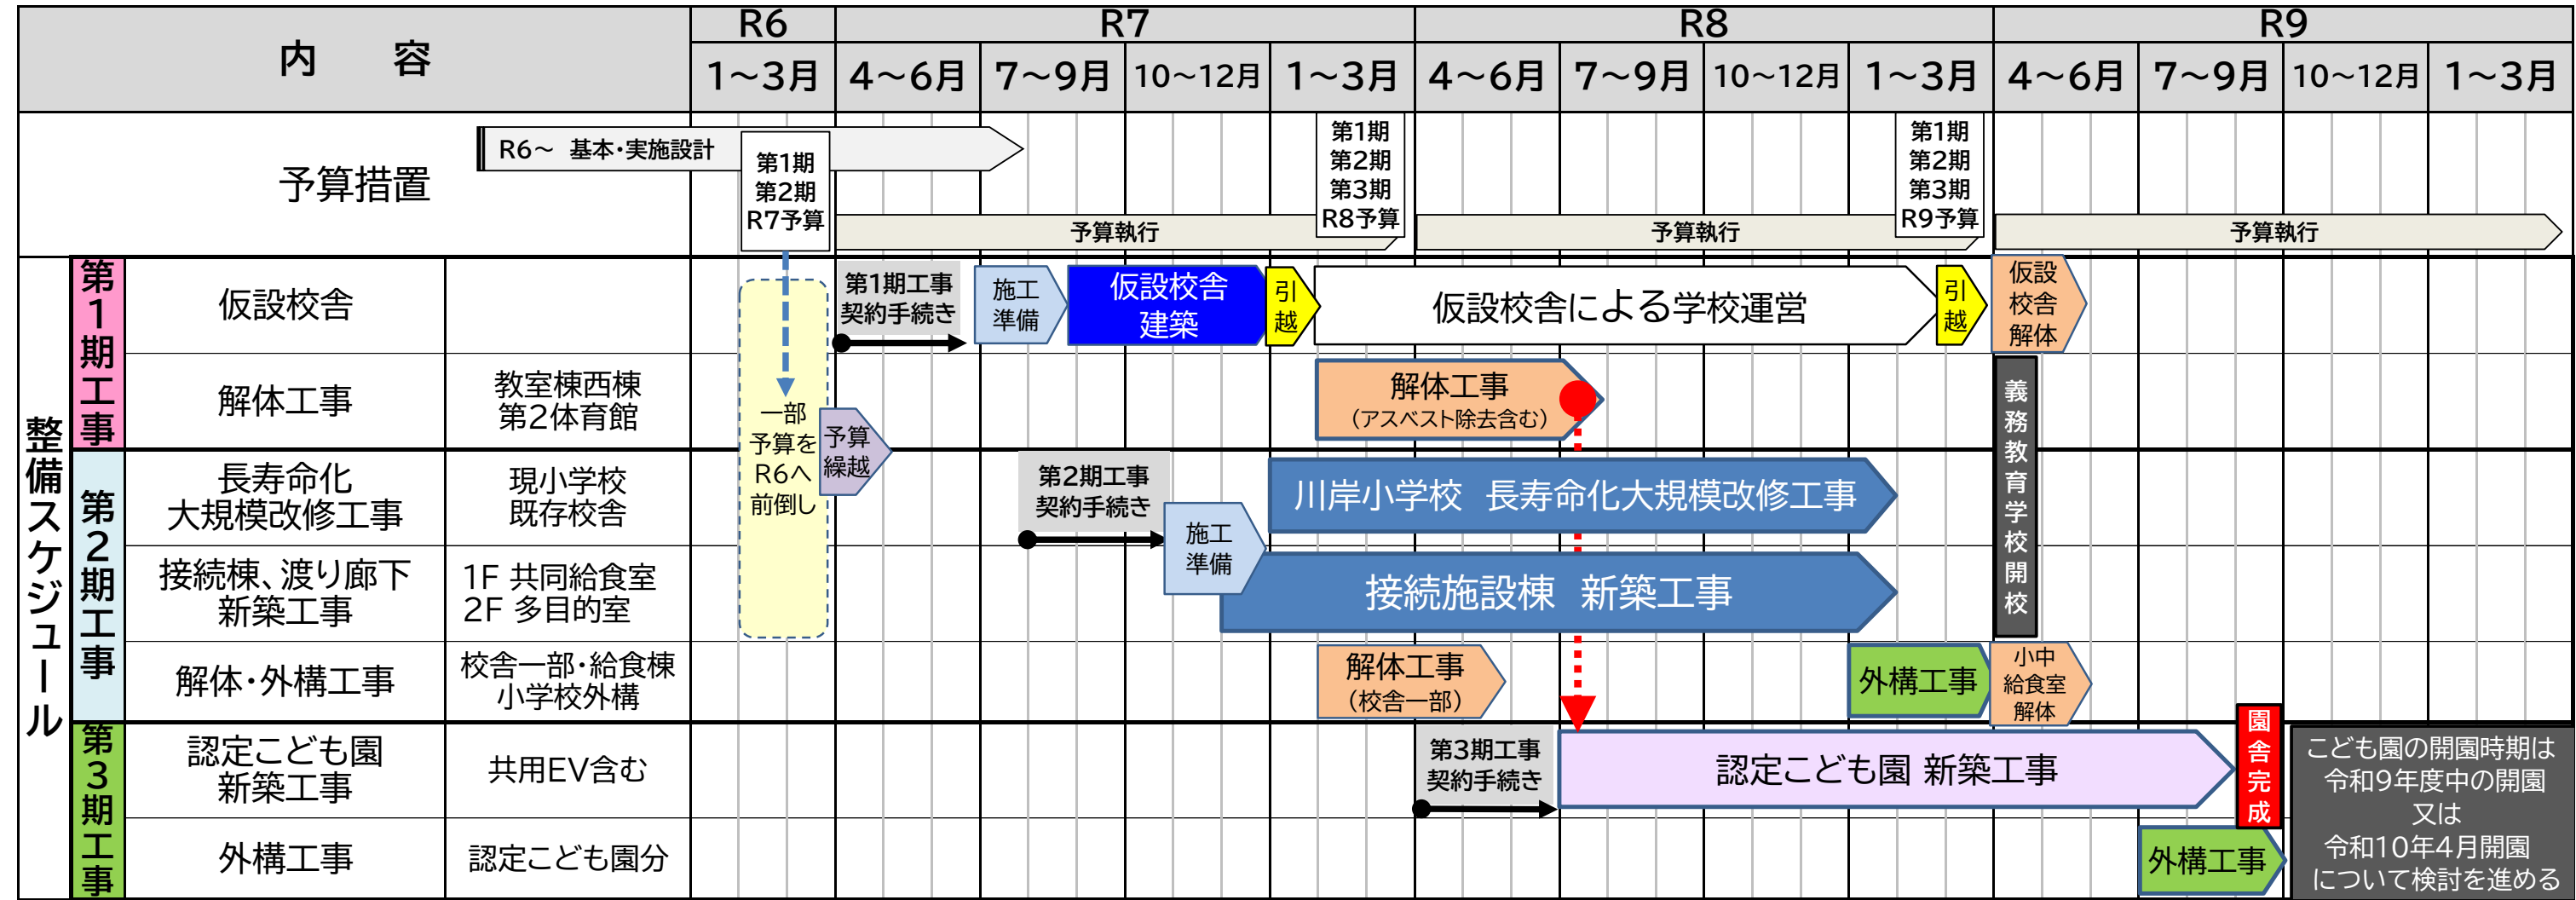

概算事業費

(単位:千円)

区分		事業費(概算)	令和6年度		令和7年度			令和8年度			令和9年度				
						前倒し分	当年度分								
工事費	第1期	475,000	一部予算R6へ前倒し		工事費	第1期	(226,000)	10,000	工事費	第1期	215,000	工事費	第1期	24,000	
	第2期	2,831,000				第2期	(120,000)	1,000		第2期	2,570,000		第2期	140,000	
	第3期	920,000								第3期	370,000		第3期	550,000	
委託費・備品費・事務費		234,000	設計委託費(R6執行中)		105,000	委託費・備品・事務費		(44,000)	15,000	委託費・備品・事務費		50,000	委託費・備品・事務費		20,000
全体事業費(概算)		4,460,000	令和6年度 事業費		105,000	令和7年度 事業費		(390,000)	26,000	令和8年度 事業費		3,205,000	令和9年度 事業費		734,000

財源内訳

国・県補助金	1,398,000	国・県補助金		国・県補助金	(65,000)	2,000	国・県補助金	1,064,000	国・県補助金	267,000
市債	2,761,000	市債	69,000	市債	(325,000)	20,000	市債	1,928,000	市債	419,000
一般財源	301,000	一般財源	36,000	一般財源	(0)	4,000	一般財源	213,000	一般財源	48,000

※スケジュール、事業費及び財源は、令和7年1月時点における見込みであり、今後の経済情勢や財源見通しの状況等により変更となる場合があります。

【概算事業費の基本的事項】

- 学校・園舎整備工事は、物価変動のリスク分散や工事工程の流動性の確保等を考慮して、3工期に分けて発注
- 当初目標額からの増額は、アスベスト対策費の追加、物価・建築資材高騰、業者の週休2日制導入に伴う影響等による
- 財政負担の軽減に向け、令和6年度の国補正予算に伴う事業の一部前倒しにより財源確保
- 認定こども園整備に関しても、他省庁の交付金事業（国交省：都市構造再編集中央支援事業）の採択に向けた対応を進める
- 整備後、義務教育学校の開校は令和9年4月を予定、認定こども園の園舎完成は令和9年8月～9月頃を見込む
- 認定こども園の開園時期については、保護者の意向等を確認しながら、令和9年度中又は令和10年4月開園を調整

施設別 概算事業費

区分	概算事業費	当初目標額
学校施設整備	3,470,000	3,000,000
こども園整備	990,000	700,000
計	4,460,000	3,700,000
