

## 第2期

# 岡谷市公共施設個別施設計画（案）

【計画期間：2026年度～2035年度】

長野県岡谷市

## 目 次

### 第1章 公共施設個別施設計画の概要

1	計画の目的	1
2	計画の位置づけ	1
3	計画期間	2
4	第1期岡谷市公共施設個別施設計画の総括	2

### 第2章 公共施設等総合管理計画における公共施設の現状と課題

1	人口動向	4
2	公共施設の状況	5
3	公共施設の建設推移	6
4	維持管理経費の推移	7
5	有形固定資産減価償却の推移	7
6	公共施設（普通会計建物分）の数値目標	8

### 第3章 対象施設および策定手法

1	計画の対象施設	9
2	個別施設計画の基本方針	9
3	方向性決定までの流れ	10
4	施設の方向性	11
5	まちづくりの視点や関連計画等との整合性	12

### 第4章 公共施設の評価

1	評価手法について	13
---	----------	----

### 第5章 対策内容

1	対策内容の考え方	16
2	改修・修繕の整備方針	16

### 第6章 各公共施設の方針

1	行政系施設	18	8	産業系施設	34
2	市民文化系施設	22	9	社会教育系施設	38
3	子育て支援施設	25	10	スポーツ・レクリエーション系施設	41
4	学校教育系施設	28	11	保健・福祉施設	45
5	供給処理施設	30	12	文化財施設	48
6	市営住宅	31	13	その他の施設	50
7	公園施設	32			

### 第7章 計画推進に向けた取組体制

1	総合的かつ計画的な管理を実現するための体制・手法	54
2	フォローアップの実施方針	54
3	市民等との協働	55

## 第1章 公共施設個別施設計画の概要

### 1 計画の目的

今後も進行することが見込まれる人口減少や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化などによる利用状況の変化など、本市の公共施設等を適切に管理運営していく環境は予想以上に厳しいものとなっております。

このような現状を踏まえ、本市では、最適な公共施設サービスと財政運営を両立させながら、公共施設を総合的かつ統括的に企画、管理、活用する仕組みである公共施設マネジメントに取り組むこととし、その基礎資料として、市が所有する公共施設の全体像と各用途別施設の現状分析をまとめた「岡谷市公共施設等総合管理計画」を平成28年5月に策定し、公共施設等の適正管理及び有効活用の推進に関する基本的な方向性を示すとともに、「岡谷市公共施設白書」を毎年発行しています。


そして、公共施設等総合管理計画で示した今後の公共施設マネジメントの方向性を踏まえ、公共施設の適正管理を具体的に進めていくための基本方針となる「第1期岡谷市公共施設個別施設計画（令和3年度～令和7年度）」に続いて、「第2期岡谷市公共施設個別施設計画（令和8年度～令和12年度）」を策定しました。

今後、本計画に基づき、将来の市の財政状況や人口規模を見据えつつ、多様化する市民ニーズへの対応や住みよいまちづくりを実現するための最適な公共施設の体系構築を推進してまいります。

なお、本計画における施設名や延床面積など保有施設に関する記述については、原則として、令和7年（2025年）3月31日を基準日として掲載しています。

### 2 計画の位置づけ

公共施設個別施設計画は、公共施設等総合管理計画で定めた今後の公共施設マネジメントの方針等を具体化し、その後の公共施設の適正管理に資するものとします。

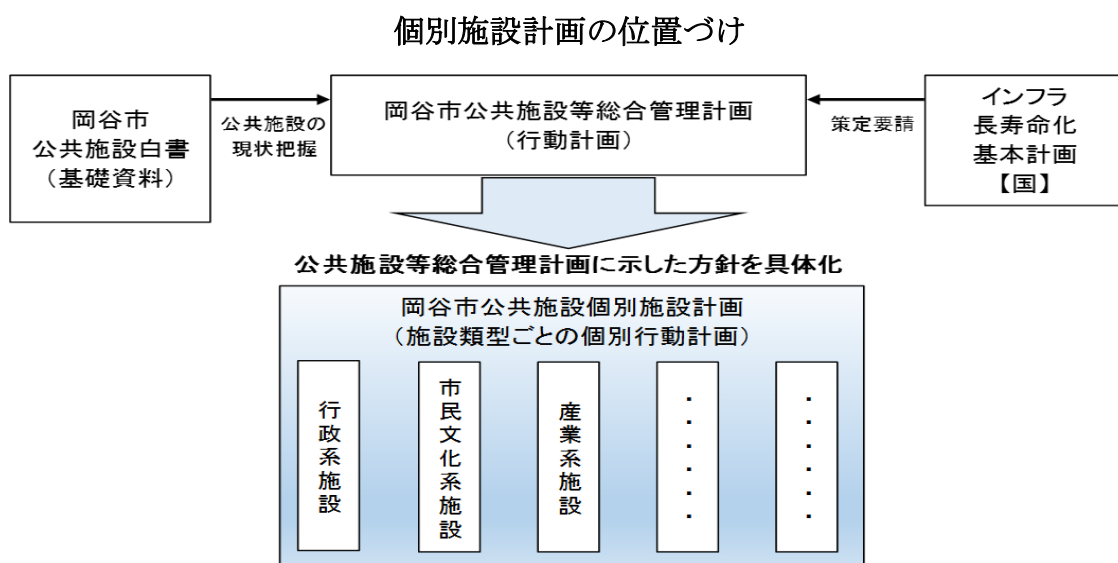

### 3 計画期間

平成 28 年 5 月に策定した公共施設等総合管理計画は平成 28 年度（2016 年度）から令和 37 年度（2055 年度）までの 40 年間を計画期間としています。本計画においても、当該計画と合わせ令和 37 年度（2055 年度）を見据えたものとします。

ただし、今後の施設方針に関する実施計画を長期の視点で策定することは、不確定要素もあり現実感の乏しいものとなることが懸念されます。そこで、本計画では概ね 10 年間を一区切りとして第 1 期から第 4 期の期間設定を行い、本市の保有する施設において今後の方針を検討することとします。

なお、本計画には公共施設の将来の方向性や改修計画が記載されていますが、令和 37 年度までの長期計画であることから、今後の社会情勢や経済状況および市民や利用者のニーズの変化等を反映し、時代の要請に沿った有効性のある計画とするため、柔軟な見直しを行っていくこととします。

#### 個別施設計画の計画期間

第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期
令和3年度～令和7年度 (2021～2025)	令和8年度～令和17年度 (2026～2035)	令和18年度～令和27年度 (2036～2045)	令和28年度～令和37年度 (2046～2055)

#### 個別施設計画のロードマップ

	令和3年度～令和7年度 (2021～2025)	令和8年度～令和17年度 (2026～2035)	令和18年度～令和27年度 (2036～2045)	令和28年度～令和37年度 (2046～2055)
個別計画				

### 4 第 1 期岡谷市公共施設個別施設計画の総括

第 1 期公共施設個別施設計画では、「方向性を検討」に位置づけた施設等の協議や施設類型の個別施設計画による進捗管理により、建物の除却や売却による延床面積の削減が図られたほか、施設の休廃止により維持管理経費の削減に努めた。

**第1期の実績(普通会計建物分) ※令和6年度までの実績**

**【延床面積削減実績】 ▲4. 38%(▲13, 287. 06㎡)**

(※第1期目標値 ▲8%以上)

**【施設の休廃止】**

ララオカヤ、塩嶺閣、つるみね保育園 など

8. 27%(25, 178. 24㎡)

# 【延床面積の削減実績】

年度	総延床面積 (㎡)	縮減率 (%)	施設名	延床面積 (㎡)		備考
				増	減	
H26 (基準年)	304,240.21	0.00	—	—	—	
H27	308,867.25	1.52	岡谷田中小学校 (学童クラブ等)	443.45		学校統合による新設
			旧塩嶺病院 (栄養棟、リハビリ棟、検診車庫等)	1,646.37		病院統合による財産持替え
			看護専門学校	2,859.49		用途変更による財産持替え
			教員住宅 (二本松、岡谷小下)		261.13	個別計画に基づく除却
			市営住宅 (中村市営)		61.14	//
			小 計	4,627.04		
H28	305,290.94	0.35	教員住宅 (間下)	996.12		取得 (起償償還完了)
			教員住宅 (上の原小東、川岸高尾市営住宅内)		175.14	個別計画に基づく除却
			岡谷西部中学校 (管理教室棟、第2体育館等)		683.83	建替えに伴う削減
			旧岡谷小学校 (北校舎、北体育館等)		2,259.82	学校統合による除却
			旧塩嶺病院 (栄養棟、病歴管理棟、ボイラー棟等)		1,231.08	病院統合による除却
			その他 (市営住宅)		222.56	台帳整備による修正
			小 計	▲ 3,576.31		
H29	299,990.41	▲ 1.40	教員住宅 (間下)	1,035.12		取得 (起償償還完了)
			教員住宅 (富士見ヶ丘、学が丘、新倉)		321.24	個別計画に基づく除却
			イルフプラザ (権利床)	97.31		取得
			旧岡谷小学校 (管理教室棟、南校舎等)		5,489.98	学校統合による除却
			旧塩嶺病院 (リハビリ棟)		601.00	病院統合による除却
			諏訪湖ハイツ (物置)		22.64	除却
			その他 (保育園)	1.90		台帳整備による修正
			小 計	▲ 5,300.53		
H30	296,772.61	▲ 2.45	市営住宅 (高尾市営)		185.92	個別計画に基づく除却
			旧塩嶺病院 (B棟、検査棟)		3,008.90	病院統合による除却
			公衆トイレ (長地、三沢)		22.98	設置方針見直しに伴い除却
			小 計	▲ 3,217.80		
R1	290,582.42	▲ 4.49	教員住宅 (中山団地、寒小坂、川岸保育園前等)		1,584.42	個別計画に基づく除却、売却
			旧西堀保育園 (園舎)		626.99	個別計画に基づく除却
			武井武雄生家		157.02	//
			市営住宅 (高尾、中村)		421.99	//
			旧塩嶺病院 (A棟等)		3,409.74	病院統合による除却
			その他	9.97		台帳整備による修正
			小 計	▲ 6,190.19		
R2	289,892.11	▲ 4.72	新西堀保育園 (園舎)	1,548.80		個別計画に基づく建替え
			ララオカヤ (権利床)	304.75		個別計画に基づく買取り
			旧塩嶺病院 (看護師団舎、検診車庫、物置等)		1,896.45	病院統合による除却
			市営住宅 (橋詰団地、高尾団地、小萩団地)		647.41	個別計画に基づく除却
			小 計	▲ 690.31		
R3	291,022.29	▲ 4.34	岡谷東部中学校 (エレベーター)	40.80		施設整備による改修
			ララオカヤ (権利床)	956.97		個別計画に基づく買取り
			防災倉庫	191.91		防災拠点移転に伴う新築
			高尾市営住宅		59.50	個別計画に基づく除却
			子ども発達支援センター	484.74		西堀保育園内に開設
			西堀保育園		484.74	子ども発達支援センター開設による面積減
			ララオカヤ	43.87		駅前出張所廃止に伴う面積増
			岡谷駅前出張所		43.87	個別計画に基づく移転
			イルフプラザ出張所	16.00		イルフプラザ出張所開設
			生涯学習館		16.00	イルフプラザ出張所開設に伴う面積減
小 計	1,130.18					
R4	290674.17	▲ 4.46	ララオカヤ (権利床)	302.13		個別計画に基づく買取り
			内山霊園合葬式墓地	9.97		新築
			諏訪湖ハイツ倉庫	18.18		カウント漏れ分の訂正
			エコファおかや		327.64	個別計画に基づく売却
			旧まゆみ園		222.76	個別計画に基づく売却
			長地小萩市営住宅		128.00	個別計画に基づく除却
			小 計	▲ 348.12		
R5	291,502.12	▲ 4.19	岡谷田中小学校	33.15		施設整備によるエレベータ増設
			ララオカヤ (権利床)	156.62		個別計画に基づく買取り
			ララオカヤ	1,867.54		未登記分の面積増
			高尾市営住宅		155.35	個別計画に基づく除却
			旧東堀保育園		784.29	個別計画に基づく除却、売却
			ララオカヤ		289.72	誤差の修正
小 計	827.95					
R6	290,953.15	▲ 4.38	生涯学習館	16.00		イルフプラザ出張所廃止に伴う面積増
			イルフプラザ出張所		16.00	イルフプラザ出張所廃止
			川岸水防庫		19.87	除却
			屋内ゲートボール場		399.23	除却
			高尾市営住宅		129.87	個別計画に基づく除却
			小 計	▲ 548.97		
H27～R6 縮減面積合計				▲ 13,287.06		

## 第2章 公共施設等総合管理計画における公共施設の現状と課題

### 1 人口動向

国勢調査に基づく人口の推移は、昭和55年（1980年）に62,210人を記録して以降、減少が進み、令和6年（2024年）には45,418人と44年間で16,792人減少（△27.0%）しています。


また、年齢区分別の人口構成割合をみると、年少人口（0～14歳）は、昭和55年（1980年）に人口の24.5%を占めていましたが、令和6年（2024年）には10.1%に減少しています。一方、老年人口（65歳以上）は、昭和55年（1980年）に人口の10.2%を占めていましたが、令和6年（2024年）には35.0%に増加しています。

児童生徒数の推移は、昭和55年（1980年）に9,302人を記録して以降、減少が進み、令和6年（2024年）には3,045人と44年間で6,257人減少（△67.3%）しています。

国立社会保障・人口問題研究所が令和5年12月に公表した試算によると、令和32年（2050年）の本市の人口は31,505人、人口構成割合では年少人口は9.3%、老年人口は43.6%になると推計されています。

全国的に人口が減少し、少子高齢化が進んでいますが、本市においても同じ傾向にあることを示しています。

一方、本市では、岡谷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンで、令和42年（2060年）における将来展望人口40,000人台の維持を目標として各種施策を推進しています。

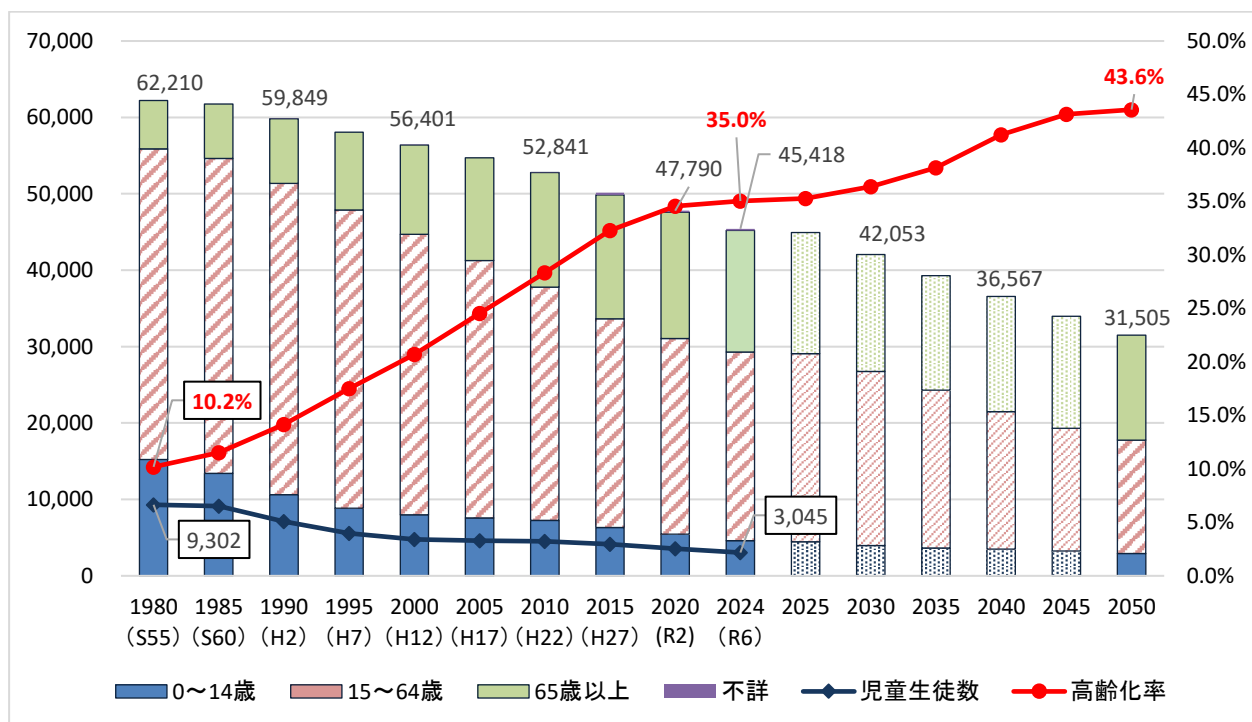


岡谷市の人口・児童生徒数の推移

## 2 公共施設の状況

公共施設はそれぞれの目的・用途に応じて運営していますが、この方針では次のように分類し、施設の概要、利用状況等をまとめています。対象となる公共施設は171施設で、延床面積は290,953.15㎡（令和6年度決算値）、施設類型別延床面積の割合については、学校教育系施設が一番高い割合になっており、市民1人あたりの延床面積は、約6.4㎡となっています。

施設類型		施設数	延床面積 (㎡)	面積割合 (%)
行政系施設	庁舎等	1	22,023.39	9.0%
	支所等	3	71.02	
	消防庁舎	1	2,626.09	
	消防施設	45	1,364.43	
市民文化系施設	文化施設	1	8,879.71	5.4%
	勤労青少年ホーム	1	887.56	
	生涯学習館等	4	5,817.74	
子育て支援施設	子育て支援館	1	1,130.00	5.0%
	保育園	13	12,524.63	
	学童クラブ	8	810.56	
学校教育系施設	小学校	7	53,610.83	31.8%
	中学校	4	36,970.19	
	教員住宅	2	2,031.24	
供給処理施設	最終処分場	1	192.39	0.1%
市営住宅	市営住宅	15	34,354.55	11.8%
公園	都市公園等	23	4,555.55	1.6%
産業系施設	再開発ビル等	7	33,305.36	11.4%
社会教育系施設	博物館等	4	6,339.01	3.1%
	図書館	1	1,942.71	
	野外活動センター	1	713.02	
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	9	21,496.71	7.4%
保健・福祉施設	総合福祉センター等	4	10,322.31	3.5%
医療施設	旧塩嶺病院	0	0.00	0.0%
文化財施設	旧林家住宅等	4	4,102.14	1.4%
その他の施設	看護専門学校	1	2,908.13	8.6%
	貸館	4	548.27	
	霊園	1	244.77	
	公衆トイレ	1	19.48	
	その他	4	21,161.36	
		171	290,953.15	100.0%


### 3 公共施設の建設推移

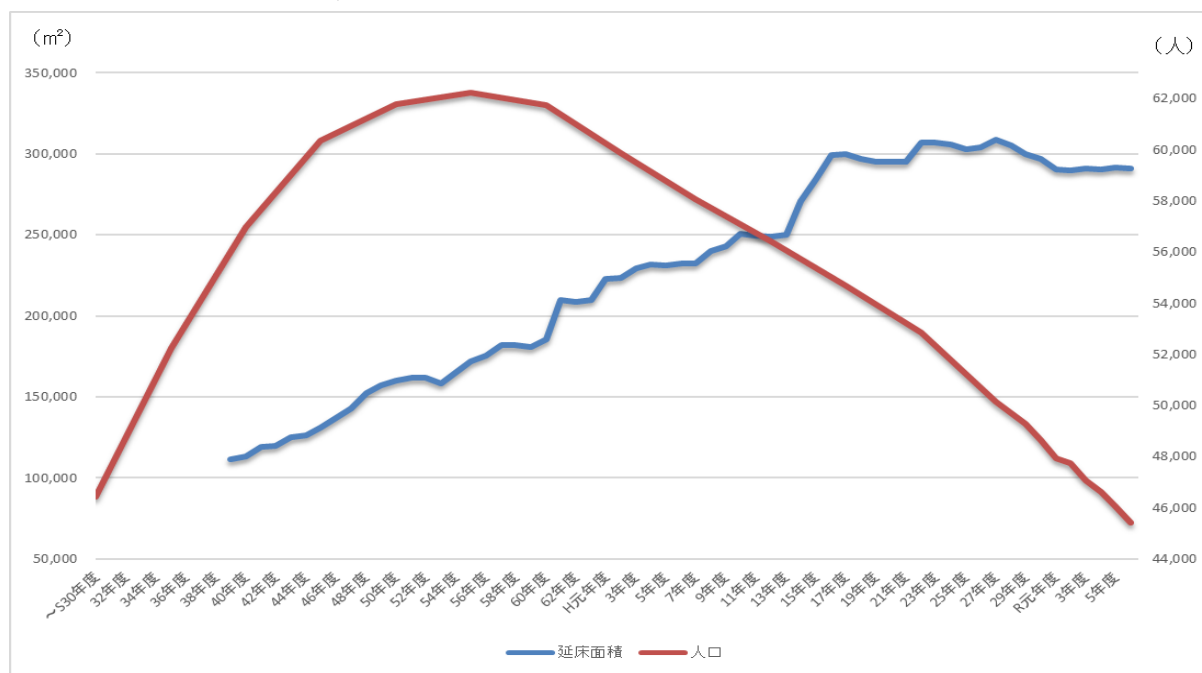

施設の延床面積及び人口推移

施設の延床面積は、市民サービスを充実させるため、施設整備を進めたことから昭和40年代（1965年）から増加傾向となっており、昭和50年代（1975年）中頃から人口が減少し始めてからも施設の延床面積の増加は続いています。今後、施設が増加しなくても現状の施設数が維持されれば、将来は人口に比べて施設の延床面積が広すぎるという状況が予想されます。

また、建築経過年数別の延床面積割合では、30～39年を経過したものが一番高い割合となっており、次いで40～49年を経過したものとなっています。大規模改修や更新が必要と見込まれる40～50年以上経過している施設が、全体の約4割に達しています。

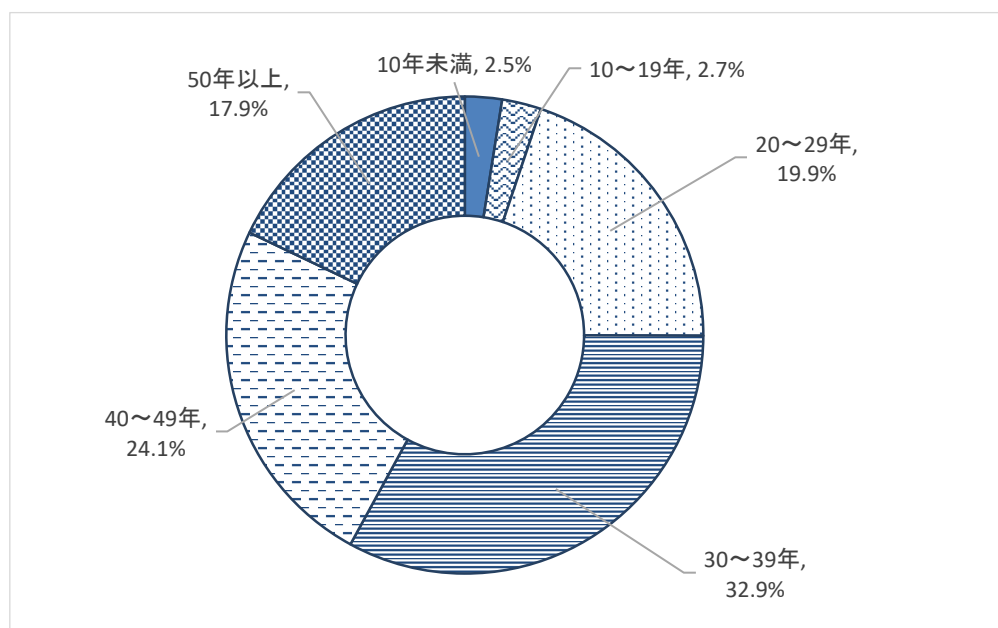


建築経過年数別の延床面積割合




#### 4 維持管理経費の推移

公共施設等総合管理計画を策定した平成28年度（2016年）以降、維持管理経費では延床面積の削減とともに圧縮が図られたものの、物価高騰等の影響により増加傾向にあります。計画策定以降の維持管理経費の平均値約42億円と策定前を比較すると、約2億円の減額となっております。

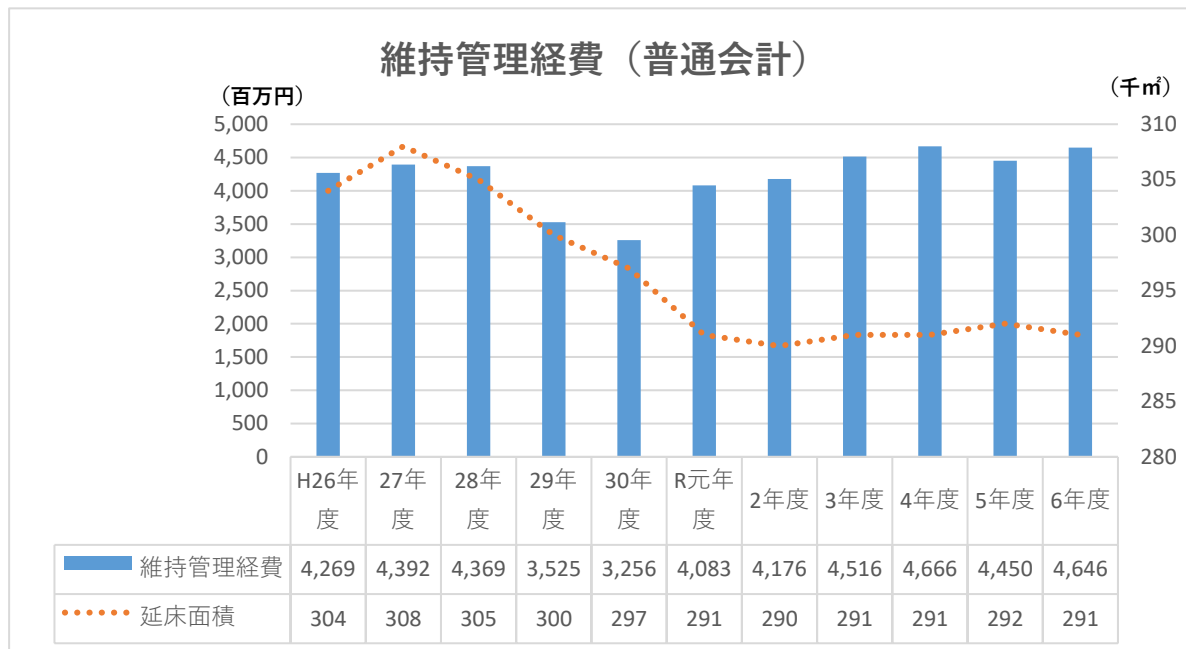

#### 5 有形固定資産減価償却の推移

有形固定資産のうち、償却資産（建物や工作物等）の取得価格に対する減価償却の割合です。この比率が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多いことを示します。

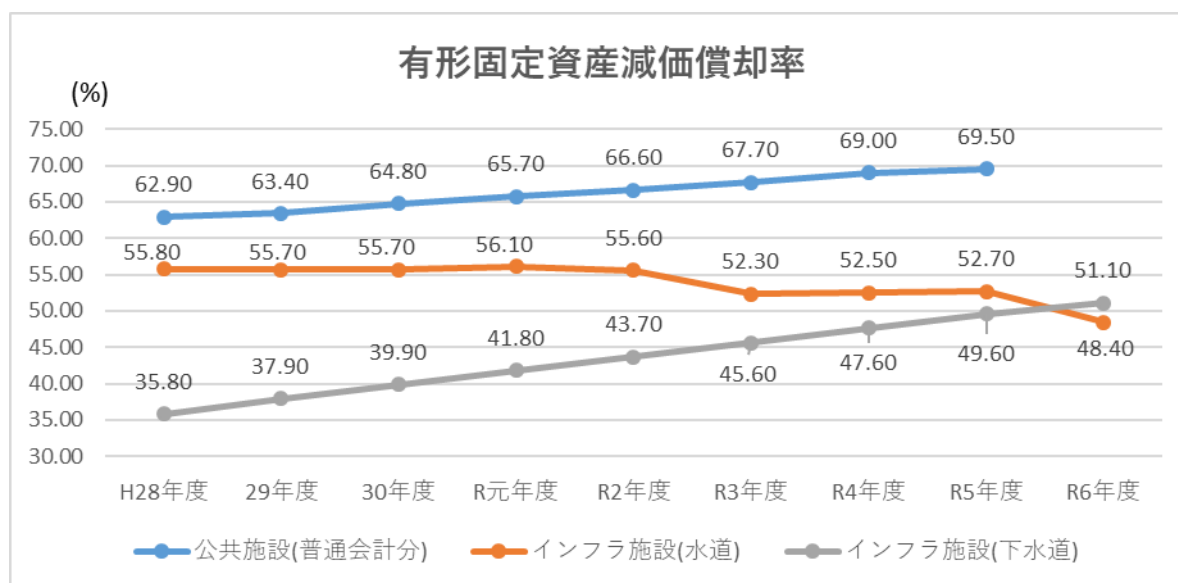

## 6 公共施設（普通会計建物分）の数値目標

第2期計画期間（令和8年度（2026年度）～令和17年度（2035年度））では、休廃止により経費が削減された施設の床面積についても目標数値に加えることとし、第1期における延床面積の縮減実績（令和6年度決算値）と第2期における公共施設の統廃合の検討に加え、既に機能を休廃止している施設の状況を踏まえ、延床面積の縮減目標を設定します。

### 公共施設（普通会計建物分）の数値目標

（基準値：304,240.21 m<sup>2</sup>（平成26年度決算値））

### 令和17年度の延床面積 ▲15%以上（▲4.5万m<sup>2</sup>）

公共施設総合管理計画 （H28策定）	第1期	第2期
	令和3年度～令和7年度 （2021～2025）	令和8年度～令和17年度 （2026～2035）
	目標：△8%以上 （△2.4万m <sup>2</sup> ）	
	実績：△4.38%※ （△1.3万m <sup>2</sup> ）	△10.62% （△3.2万m <sup>2</sup> ）
	+	
		目標：△15%以上 （△4.5万m <sup>2</sup> ）

※令和6年度決算値

## 第3章 対象施設および策定手法

### 1 計画の対象施設

本計画の対象施設は、令和6年度末時点で本市が普通会計<sup>1</sup>で保有する171施設（総延床面積290,953.15㎡）とします。なお、普通会計における道路・橋りょう・上下水道などのインフラ施設を除きます。

### 2 個別施設計画の基本方針

公共施設白書および公共施設等総合管理計画における公共施設に関する現況と課題を踏まえ、以下の基本方針に沿って、個別施設計画の策定を推進します。

## 基本方

### 資産総量の適正化

適切な市民サービスを持続的に提供していくため、人口動態や社会情勢を踏まえた、公共施設の最適な規模・機能等を検討するとともに、施設統合等の集約化や民間への移管などの推進により、将来財政負担の軽減に向けた資産総量の適正化を図ります。

### 長寿命化の推進

今後も利活用を行う施設については、公共施設等のそれぞれの特性に応じた計画的な予防保全により、施設機能の維持向上、ライフサイクルコスト<sup>2</sup>の縮減および将来財政負担の平準化に取り組みながら長寿命化を図ります。

### 更新費用等の財源確保

利用者増に向けた方策による収入確保をはじめ、特定財源の確保など様々な制度等の活用や、売却などが可能な施設・財産の積極的かつ適正な処分、さらに受益者負担<sup>3</sup>などについても検討するとともに、維持管理コストの縮減に向け、民間活力の導入等を検討しながら、更新費用等の財源確保に努めます。


<sup>1</sup> 普通会計：一般会計や特別会計の範囲は、地方公共団体ごとに異なることから、地方公共団体間の比較や国全体としての統計を可能にするために、統一の会計区分として普通会計が設けられている。岡谷市の場合は、一般会計、霊園事業特別会計、分収造林事業特別会計を合わせたものが普通会計となっている。

<sup>2</sup> ライフサイクルコスト：建物の設計から維持・管理・除却（解体）に至る過程（ライフサイクル）で必要な経費の総額。

<sup>3</sup> 受益者負担：公共施設の整備等により、特に著しい利益を受ける者がある場合に、その費用をすべて租税で賄うことはかえって公平の原則に反するので、受益者から費用の一部を徴収することによって費用負担の公平を図ろうとするもの。

### 3 方向性決定までの流れ

計画では前記の基本方針や平成20年（2008年）4月に公表した「岡谷市の公共施設のあり方方針案」およびすでに策定されている各種計画、並びに施設類型の特性等を踏まえ、施設ごとの方向性を示しています。なお、方向性の決定にあたっては公共施設の現状を把握することから始まり、それぞれの施設を客観的に把握する一次評価、数値では表せない「性質」を考慮する二次評価を行いました。

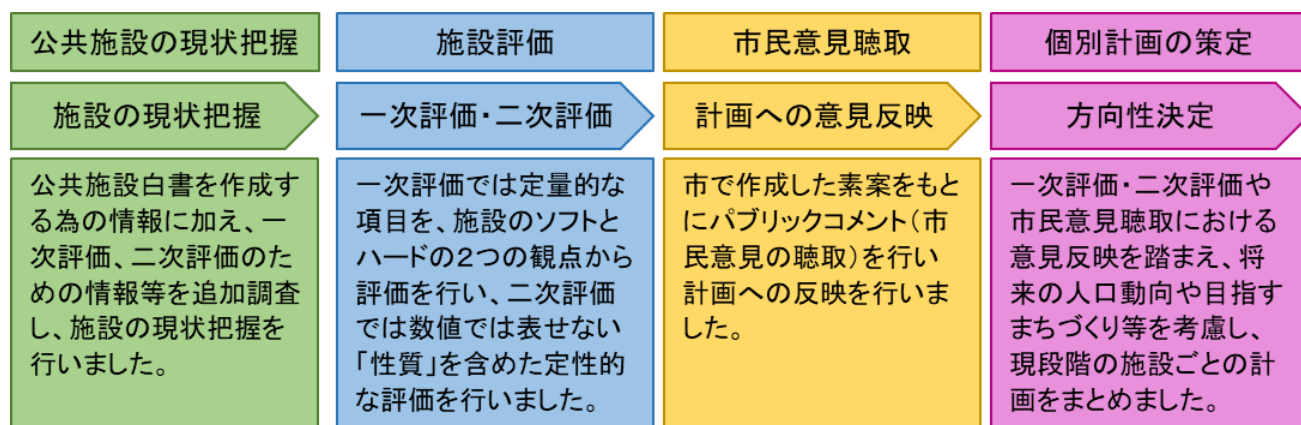

#### 4 施設の方向性

施設の方向性については、統合、複合、維持、用途変更、廃止・解体、移譲の大きく6つの中から検討を行いました。(図3-1)

また、各方向性を選択した場合の費用対効果がどの程度あるのかを把握するため、以下の表に示すように、各方向性において削減できるコストを整理しました。(表3-1)

図3-1 施設の方向性イメージ



























施設の方向性	取組前		取組後	
統合 (移転・集約)	移転  集会所	統合  コミュニティセンター	移転  集会所	統合  コミュニティセンター 機能の類似する施設を統合 (片方を廃止)
統合 (新設)	新設  集会所	新設  コミュニティセンター	新設  集会所	新設  コミュニティセンター  新コミュニティセンター 機能の類似する施設を統合・新設
複合 (移転・集約)	移転  庁舎出張所	集約  福祉センター	移転  庁舎出張所	集約  福祉センター 機能の異なる施設を集約(片方を廃止し、余剰スペースへ機能移転)
複合 (新設)	新設  集会所	新設  コミュニティセンター	新設  集会所	新設  コミュニティセンター  複合施設 機能の異なる施設を集約・新設
維持 (長寿命化)			 大規模改修・更新をして維持	
用途変更	 産業系施設		 社会教育系施設 利用目的を変更	
廃止・解体	 集会所		 集会所 廃止して解体	
移譲	 集会所		 集会所 所有権を民間・地域等へ譲渡	

表 3 - 1 施設の方向性

方向性		説明	機能 (ソフト)	施設 (ハード)	事業 運営費	維持 管理費	建設費	大規模 改修費	解体費
統合	移転	同一機能を持つ他施設へ移転	継続	廃止	○	×	×	×	○
	集約	同一機能を持つ他施設を受入	継続	継続	○	○	○	○	×
	新設	同一機能同士で新施設へ移転	継続	新設	○	○	○	○	×
複合	移転	異なる機能を持つ他施設へ移転	継続	廃止	○	×	×	×	○
	集約	異なる機能を持つ他施設を受入	継続	継続	○	○	○	○	×
	新設	異なる機能同士で新施設へ移転	継続	新設	○	○	○	○	×
維持		維持(長寿命化)して運営	継続	継続	○	○	○	○	×
用途変更		施設の設置目的を変更	廃止	継続	×	○	○	○	×
廃止・解体		廃止して取壊し	廃止	廃止	×	×	×	×	○
移譲		施設等の所有権を民間・地域等へ 譲渡(有償又は無償)	廃止	廃止	×	×	×	×	×

※○・・・今後もコストがかかることを示しています。

※×・・・廃止時点でコストがかからなくなることを示しています。

※廃止は市として管理しないことを示し、譲渡など解体を行わないものも含まれます。

## 5 まちづくりの視点や関連計画等との整合性

個別施設計画を実行性のあるものとするためには、単に公共施設の枠内のみで考えるのではなく、市内の民間施設や公共交通機関等の現状も併せて検討する「まちづくりの視点」が重要となります。

そして、これらの要素を取り入れた検討を行うためには、長期総合計画など市の将来構想やまちづくりに関係する既存の計画との整合性への配慮が求められます。

個別施設計画の進捗管理にあたり、第5次岡谷市総合計画や都市計画マスタープランなど、上位・関連計画を踏まえ、将来のまちのビジョンとの整合性を図りながら進めてまいります。

## 第4章 公共施設の評価

### 1 評価手法について

公共施設の方向性の検討にあたっては、客観的に各施設の状況を評価した上で、どの施設をどのような方法で方向性を決定していくかを検討する必要があります。

一次評価では、施設のサービスの観点（ソフトの軸）と、建物の観点（ハードの軸）の二つの軸に分け、各施設の状況を定量的に評価し施設ごとに数値化を行いました。数値化した結果を下図に照らし合わせ、4象限のどこに配置されるかで今後の公共施設の方向性を検討する基礎情報としました。

一次評価は、建物劣化度や運営状況等の数値を基準とした機械的な評価であることから、二次評価では、施設の設置意義、施設機能、施設の利用状況、施設の劣化度などを考慮した評価を行いました。

図4-1 施設評価（ポートフォリオ分析）

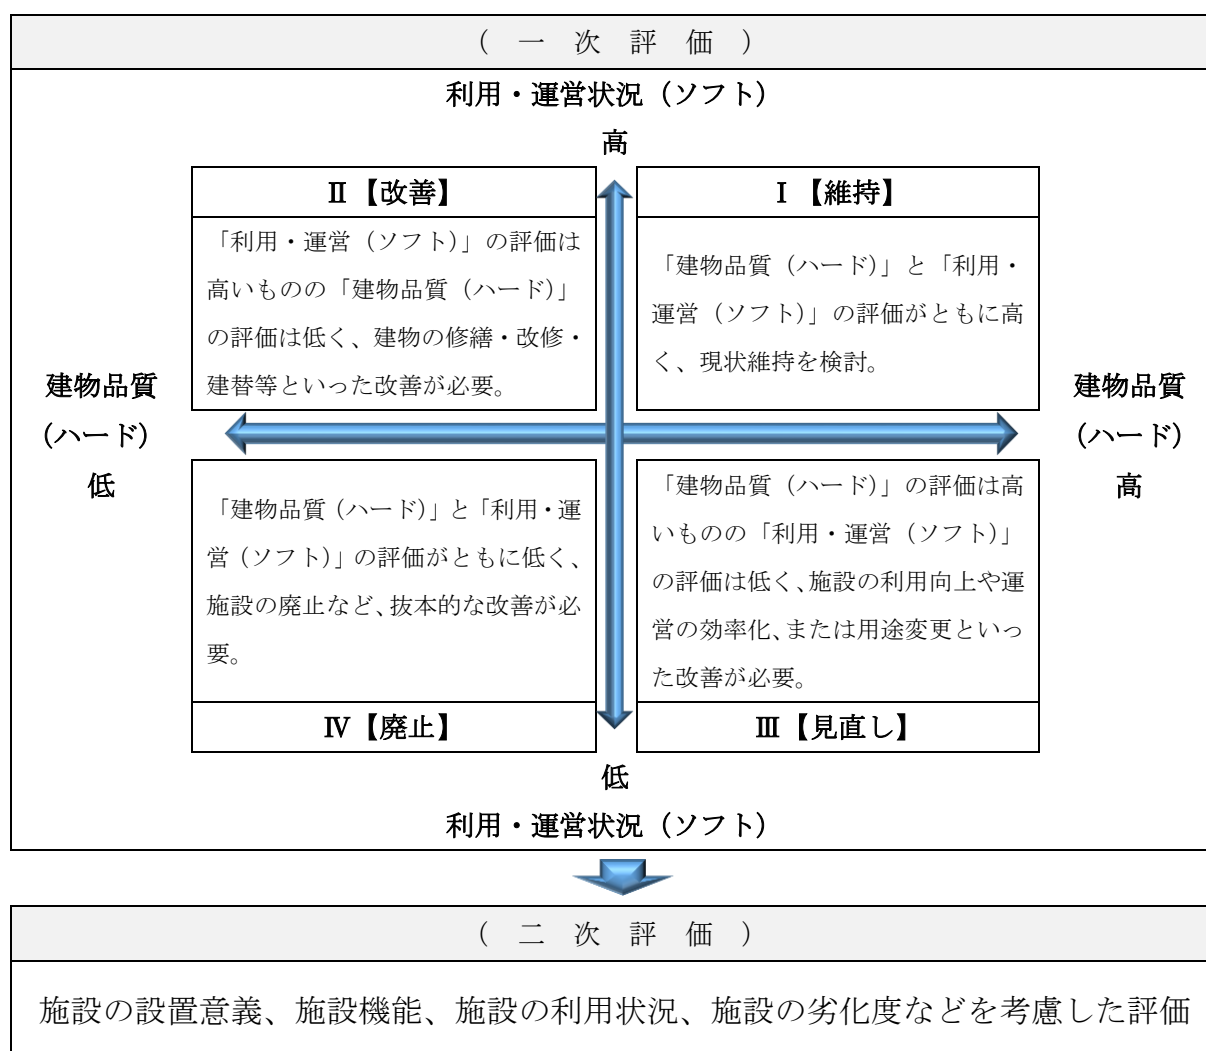


表 4 - 1 1 次評価に用いる指標

用途別分類	ハード(品質)情報 ※全施設での比較		耐震性能	ソフト(供給・財務)情報 ※用途類型ごとの比較	
	築年数	現況劣化度		利用状況	運営状況
行政系施設				なし	市民1人あたり一般会計負担額
市民文化系施設	令和元年を基準とした建築年からの経過年数	現地調査等により算出した施設の劣化度	昭和56年以降の建設で建築基準法の新耐震基準を満たしている部分の床面積、及び耐震補強を実施している部分の床面積の施設全体に対する割合	1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
子育て支援施設				①園児定員充足率(園児数/定員) ②1人あたり面積(床面積/園児数)	園児1人あたり一般会計負担額
市営住宅	※1施設で複数棟ある場合には、棟毎の床面積に応じた加重平均により算出する。	※1施設で複数棟ある場合には、棟毎の床面積に応じた加重平均により算出する。		入居率(入居戸数/管理戸数) ※H26～H30の5カ年	入居世帯あたり一般会計負担額
公園				1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
産業系施設				1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
社会教育系施設				1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
スポーツ・レクリエーション系施設				1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
保健・福祉施設				1日平均利用者数 (年間利用者数/開場日数/床面積)	利用者1人あたり一般会計負担額
供給処理・給湯施設等				なし	市民1人あたり一般会計負担額



表 4 - 2 2 次評価に用いる指標

評価視点	評価項目	見直しの方向性(選択肢)	
		○	×
1. 施設の設置意義	① 施設の設置目的が現状の市民や利用者のニーズと一致しているか。	維持	廃止、用途変更
	② 施設の設置目的が利用実態に整合しているか。	維持	廃止、移譲、用途変更
	③ 施設の設置目的に即した専用施設でなければならぬか。	維持	複合化
2. 施設の機能	① 公共施設間で機能が重複していないか。	維持	廃止、統合、複合化、用途変更
	② 民間で同種・同様のサービスが提供されていないか。	維持	廃止、移譲、用途変更
	③ 市全域から見ても適正な配置となっているか。 (配置バランス、利用機会の平等等)	維持	統合、複合化
	④ 機能が向上し、効率的・効果的な運営がなされているか。	維持	統合、複合化
3. 施設の利用状況	① 利用率(利用者数)が低下していないか。	維持	廃止、統合、複合化、用途変更
	② 利用者が一部の地域や団体等に集中(占有)していないか。	維持	移譲
4. 施設の劣化	① 施設の劣化により、施設の安全性や快適性、機能性が失われているか。	維持	更新、改修、廃止、統合、複合化
	② 施設の機能の維持に、多大な財政負担を要さないか。	維持	更新、改修、廃止、統合 複合化(機能移転)

## 第5章 対策内容

### 1 対策内容の考え方

建物は経年により劣化する一方で、耐震性能や省エネ性能などの社会的要求水準は年々高まるため、定期的に改修・修繕を行わなければ建築物の機能に支障が生じます。施設の安全性および機能性を保つため、設備機器の定期点検、法定点検等を確実に実施するほか、「改修の優先度等」および「個別施設の状況等」を踏まえ、「岡谷市の公共施設の保全ガイドライン」に基づき、施設の目標耐用年数を80年とし、施設の機能や利用状況などの特性に応じて、適切な時期に改修・修繕を行い、施設機能の維持・向上と長寿命化を図ります。

表 5 - 1 改修・修繕の周期

時期	築20年	築40年	築60年
	(目標耐用年数の1/4)	(目標耐用年数の1/2)	(目標耐用年数の3/4)
手法	中規模改修 (機能回復)	大規模改修	中規模改修 (長寿命化)
目的	経年により通常発生する損耗、機能低下に対する機能の回復を図る。	社会的要求(省エネ化、ライフラインの更新等)に応じた改修を行い、機能の向上を図る。	経年により通常発生する損耗、機能低下に対する機能の回復と社会的要求を反映した機能の向上を図る。

### 2 改修・修繕の整備方針

長寿命化する施設は、以下の配慮を加えながら、各部位の整備レベルを設定した改修等を行います。(表 5-2、5-3)

また、施設別に残存耐用年数評価に応じて行うべき事が異なりますので、残存耐用年数に応じた改修・修繕に対する考え方を整理します。(表 5-4)

表 5 - 2 長寿命化において配慮すべき項目

項 目	内 容
可 変 性	将来の機能向上や用途変更に対応できるように、機械室、配管スペース、階高、設計荷重等に余裕を持たせる設計とする。
更 新 性	建築物を構成する部材は多く、それぞれの耐用年数も異なり、物理的、機能的劣化の速度も異なることから、改修工事の際は耐用年数があるほかの部位に影響がないよう、更新可能な構造とする。
耐 久 性	使用する部材は、ライフサイクルコストを考慮して耐久性の高いものを選択する。
メンテナンス性	清掃や保守点検、修繕等の維持管理業務を効率的に実施するため、足場やゴンドラの設置を可能とする。
省エネルギー 省資源	再生可能エネルギーの活用等も含め環境負荷の低減に対応した設計とする。

表 5-3 整備レベルの設定

整備の目的		A 各部の機能を最大限に向上	B 内部改修と同時に機能を向上	C 長寿命化する部位を中心に改修	D 維持補修等
整備レベル		高 <div><div></div></div> 低			
部 位		改修工事の内容			
外部仕上	屋根・屋上	断熱保護防水	断熱シート防水	シート防水	浮き部補修
		金属屋根葺替	カバー工法	ウレタン塗布	塗装
	外壁	外断熱化 (湿式、乾式)	外壁吹付（防水型複層材等）		浮き部補修 (クラック補修程度)
			内断熱	断熱なし	
	外部開口部	サッシ交換 (複層ガラス等)	カバー工法	ガラス交換	シーリング打替 (開閉調整程度)
			(複層ガラス等)		
	その他外部	日射抑制措置	庇等を設置しない		
手すり等鉄部塗装					
内部仕上	内部仕上げ (居室等)	内装全面改修 (木質化等)	内装部分改修 天井：塗装	内部仕上修繕 天井：塗替	既存のまま
	便所	内装全面改修 (ドライ化等)	壁：塗装 床：張替 等	壁：塗替 床：補修 等	既存のまま
		器具交換 (感知式等)	器具交換 (暖房洗浄型)	器具交換 (節水型等)	既存器具のまま
電気設備	受変電設備	受変電設備交換（容量の適正化）			
		自家発電設備更新			
	照明器具	幹線更新	配線類更新		
		LED照明に交換 (人感センサー、照度センサー付)		LED照明 に交換	
機械設備	給水排水設備	給水設備改修（給水方式変更、給水ポンプ更新）			
		雨水・中水利用	給水管交換		
	空調設備	マルチエアコン	パッケージ (GHP／EHP)	中央方式	FF式暖房機
		カセット、熱交換器交換			換気扇類交換

表 5-4 残存耐用年数に応じた改修・修繕および更新の時期

区 分	対象施設	修繕・改修に対する考え方
残存 20 年未満 (築 60 年以上)	長寿命化が困難な施設	残存耐用年数が 20 年未満の施設は、安全性・機能性に著しい不具合がある場合を除き修繕・改修を行わないことします。
残存 20 年以上 40 年未満 (築 40 年以上)	建替えまでに修繕・改修を行い 20 年以上使用する施設	残存耐用年数が 20 年以上 40 年未満の施設は、当初 20 年間に中規模な修繕を行い、長寿命化を図ります。
残存 40 年以上 (築 40 年未満)	長寿命化が可能で 40 年以上長く使える施設	残存耐用年数が 40 年以上の施設は、当初 20 年間に機能向上などの改修を行い、今後長期にわたって使用します。

## 第6章 各公共施設の方針

### 1. 行政系施設

#### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
1	岡谷市役所	22,023.39	SRC造	昭和62年	37	－	50.5	－
2	岡谷市役所湊支所	27.06	※公民館内	昭和54年	45	Ⅳ	48.6	33.4
3	岡谷市役所川岸支所	20.30	※公民館内	昭和53年	46	Ⅳ	47.2	47.7
4	岡谷市役所長地支所	23.66	※公民館内	昭和56年	43	Ⅱ	47.5	57.7
5	岡谷市役所イルフプラザ出張(廃止)	－	－	－	－	－	－	－
6	諏訪広域連合消防庁舎	2,626.09	S造・RC造	平成26年	10	－	69.8	－
7	消防施設	1,364.43	S造 他	－	－	－	53.6	－

※公民館に併設されている支所は公民館の情報により評価を行っています。

#### (2) 施設の主な役割と現状・課題

##### 【岡谷市役所】

市民の安全、安心な暮らしを支えるために必要な行政サービスの提供や各種手続きを行う主要な施設であり、また、災害時には、災害対策本部の機能を果たすなど防災の拠点施設となります。

昭和62年に建築され、躯体および大規模設備など整備に着手できていない部分については老朽化が進行しており、施設の長寿命化に向けた施設整備が課題であるため、耐用年数に応じて改修工事を行っています。また、施設機能を維持するための設備等についても、予防保全を念頭に、利用者の利便性の向上の観点を含めた更新が求められています。

##### 【岡谷市役所湊支所・岡谷市役所川岸支所・岡谷市役所長地支所】

各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、温泉メタル等の販売や市役所への提出書類の預かりを行うなど、市民に直結した幅広い行政サービスを提供しています。3支所ともに昭和50年代に建築され老朽化が進行しており、適切な維持管理とあわせ、社会ニーズの変化に応じた施設機能のあり方の検討をする必要があります。

##### 【イルフプラザ出張所(旧岡谷駅前出張所)】

各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、防災ラジオ・福祉タクシー回数券の販売や市役所への提出書類の預かり等の行政サービスを提供してきましたが、マイナンバーカードの普及によるコンビニでの証明発行件数の増加とともに、出張所での取扱件数は減少傾向にあったことから、令和6年度末をもって廃止しました。

### 【諏訪広域連合消防庁舎】

岡谷市民の安全で安心な暮らしの確保はもとより、諏訪圏域すべての住民の生命、身体、財産を守るという、消防の重要な任務を遂行するため、平成27年（2015年）4月に供用開始され、諏訪広域消防の一元化による新体制も同時にスタートしました。免震構造により、大規模な地震が発生しても、平時と変わらぬ機能を発揮できるよう堅牢であるとともに、防災、減災の拠点施設として最新鋭の機能を整備した庁舎となっています。

### 【消防施設】

消防団屯所、ポンプ格納庫、水防庫は、各種の災害に対して活動を行うための拠点となる施設です。各施設は市内に分散して配置されており、地域住民の安全・安心を確保しています。

## （3）施設の具体的な方向性・対策の内容等

### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
1	岡谷市役所	継続	継続	維持・最適化工事	大規模改修		中規模改修
				実施 470,300	904,000		272,000
				市民の皆様が安全、安心に暮らしていくために必要なサービスの提供や各種手続きを行う主要な施設です。また、災害時には、災害対策本部の機能を果たすなど、防災の拠点施設となります。建物は昭和62年に建築され老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
2	岡谷市役所湊支所	継続	継続	岡谷市湊公民館のスケジュールに準じます。			
				岡谷市湊公民館内に設置されており、各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、温泉メタル等の販売や市役所への提出書類の預かりを行うなど、市民に直結した幅広い行政サービスを提供しています。建物は昭和54年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			
3	岡谷市役所川岸支所	継続	継続	岡谷市川岸公民館のスケジュールに準じます。			
				岡谷市川岸公民館内に設置されており、各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、温泉メタル等の販売や市役所への提出書類の預かりを行うなど、市民に直結した幅広い行政サービスを提供しています。建物は昭和53年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			
4	岡谷市役所長地支所	継続	継続	岡谷市長地公民館のスケジュールに準じます。			
				岡谷市長地公民館内に設置されており、各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、温泉メタル等の販売や市役所への提出書類の預かりを行うなど、市民に直結した幅広い行政サービスを提供しています。建物は昭和56年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
5	岡谷駅前出張所	検討	廃止	廃止 R3.12.27 閉鎖			
	平日の時間延長および土日のサービスを行うため、岡谷駅前ビル「ラオカヤ」1Fに開設しています。各種受付業務、各種証明書の発行業務をはじめ、市税・保険料・使用料および手数料などの受領、防災ラジオ・温泉コイン等の販売や市役所への提出書類の預かりを行うなど、市民に直結した幅広い行政サービスを提供しています。ラオカヤの廃止方針に伴い、機能の移転・廃止等について検討を行います。						
	イルプラザ出張所	検討	検討	開設 R4.1.12 開設			
	【検討結果】 ラオカヤの廃止方針に伴い、令和3年12月27日を以て「岡谷駅前出張所」は閉鎖して、岡谷市イルプラザ3階生涯学習館へ移設することとし、令和4年1月12日から「イルプラザ出張所」として開設しました。 イルプラザ出張所の開設期間は、令和6年度末(R7.3.31)までとし、令和4年度末(R5.3.31)を一つの区切りとして、取扱状況やマイナンバーカード普及状況を考慮し継続を判断します。なお、その際は、証明業務とは別に収納業務の廃止、継続を検討します。						
	イルプラザ出張所	廃止	廃止	廃止 R7.3			
6	【検討結果】 証明発行業務では、マイナンバーカードの普及に伴うコンビニでの発行件数の増加により、出張所での取扱件数は減少しており、収納業務においても年々減少傾向にあることから、当初の計画どおり令和6年度末で廃止しました。						
	諏訪広域連合消防庁舎	継続	継続	諏訪広域連合の改修計画に準じます。			
7	岡谷市民の安全で安心な暮らしの確保はもとより、諏訪圏域に住むすべての住民の生命、身体、財産を守るという、消防の重要な任務を担っています。大規模な地震が発生しても、平時と変わらぬ機能を発揮できるよう堅牢であるとともに、防災、減災の拠点施設として高機能な庁舎です。諏訪広域連合で策定される改修計画により計画的な改修を行います。						
	消防施設 第1分団～第11分団	継続	継続	大規模改修	大規模改修	中規模改修	中規模改修
				実施 79,800	14,000	34,000	10,000
消防団屯所、ポンプ格納庫、水防庫は、各種の災害に対して活動を行うための拠点となる施設です。各施設は市内に分散して配置されており、地域住民の安全・安心を確保しています。災害時などに施設がその機能を十分発揮できるよう、建築後年月が経過した施設に対しては改修工事を行うなど長期的な維持管理を図ります。							

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
1	岡谷市役所	継続	継続		大規模改修 632,000			大規模改修 272,000					
									劣化度調査				
2	岡谷市役所湊支所	継続	継続			岡谷市湊公民館のスケジュールに準じます。							
									劣化度調査				
3	岡谷市役所川岸支所	継続	継続			岡谷市川岸公民館のスケジュールに準じます。							
									劣化度調査				
4	岡谷市役所長地支所	継続	継続			岡谷市長地公民館のスケジュールに準じます。							
									劣化度調査				
5	イルプラザ出張所 (令和6年度廃止)	—	—										

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
6	諏訪広域連合消防庁舎	継続	継続			諏訪広域連合の改修計画に準じます。							
7	消防施設	継続	継続	大規模改修	大規模改修								
				11,000	3,000								
									劣化度調査				

## 2. 市民文化系施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
8	岡谷市文化会館【カノラホール】	8,879.71	RC造	平成元年	35	Ⅲ	55.0	49.9
9	岡谷市勤労青少年ホーム	887.56	RC造・S造	昭和49年	50	Ⅳ	45.6	51.6
10	生涯学習館 【イルフプラザカルチャーセンター】	3,705.76	※イルフプラザ内	平成8年	28	I	57.9	50.8
11	岡谷市役所湊公民館	585.77	RC造	昭和54年	45	Ⅳ	48.6	45.7
12	岡谷市役所川岸公民館	713.30	RC造	昭和53年	46	Ⅳ	47.2	45.7
13	岡谷市役所長地公民館	812.91	RC造	昭和56年	43	Ⅱ	47.5	54.4

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【岡谷市文化会館】

文化の振興と市民福祉の向上を目的に平成元年（1989年）に開館しました。舞台芸術文化の拠点として、優れた舞台芸術作品を鑑賞する機会の充実を図るほか、特色ある芸術作品の企画や製作に取り組んでいます。また、次代を担う人材、リーダーの育成や市民参加型事業の推進により、市民の芸術文化活動の活性化を図っています。平成元年（1989年）に建築しており、建物、設備等の更新工事を計画的に行っています。

#### 【岡谷市勤労青少年ホーム】

勤労青少年の福祉の増進および健全な育成を図る目的として、勤労青少年団体等により余暇時間を利用して活発な活動が行われています。また、教養・趣味・運動など様々な講座を開催しています。昭和49年（1974年）に建築しており老朽化が進行しています。

#### 【生涯学習館】

岡谷市イルフプラザ条例（平成14年岡谷市条例第32号）に基づき、ライフステージに応じた生涯学習機会の提供を図ることを目的に設置されています。

イルフプラザカルチャーセンターを愛称とし、子どもから高齢者まで、だれもが集いやすく、安らぎと活気を感じられる場として、多様な学習ニーズに対応しています。平成8年（1996年）に建築しており老朽化が進行していることから、耐用年数を迎えた設備は順次更新しています。

#### 【岡谷市役所湊公民館・岡谷市役所川岸公民館・岡谷市役所長地公民館】

社会教育法第24条及び地方自治法第244条の2および岡谷市公民館条例（昭和39年岡谷市条例第24号）に基づき、地域に根ざし、すべての年齢層にわたる市民等が気軽に集い、学び合える生涯学習の拠点として設置されています。また、貸し館事業、各種イベントや学級・講座等の開催、学習グループへの支援、図書室運営等を行っています。

3公民館とも昭和50年代に建築しており老朽化が進行しています。



### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
8	岡谷市文化会館	継続	継続	中規模改修	大規模改修		中規模改修
				実施 76,700	400,000		184,000
				文化の振興と市民福祉の向上を目的として、優れた舞台芸術作品を鑑賞する機会の充実など市民の芸術文化活動の活性化を図っています。 本市の芸術文化活動の拠点となる施設であります。平成元年に建築され、建物および舞台設備等の老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
9	岡谷市勤労青少年ホーム	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				勤労青少年の福祉の増進および健全な育成を図る目的として、勤労青少年団体等により余暇時間を利用して活発な活動が行われています。現在の建物は昭和49年に建築しており老朽化が進行していますが、大規模改修は困難であるため、利用者と協議の場を設けながら施設の統合(移転・集約)に向けて検討し、今後の方向性を決定します。			
10	生涯学習館	継続	継続	岡谷市イルフプラザのスケジュールに準じます。			
				岡谷市イルフプラザ内に設置されており、イルフプラザカルチャーセンターを愛称とし、子どもから高齢者まで、だれもが集いやすく、安らぎと活気を感じられる場として、多様な学習ニーズに対応しています。平成8年に建築しており建物および設備の老朽化が進行していますが、今後も永く生涯学習の活動拠点として活用できるよう、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
				最適化工事	大規模改修		中規模改修
11	岡谷市役所湊公民館	継続	継続	実施 13,500	31,000		17,000
				地域に根ざし、全ての年齢層にわたる市民等が気軽に集い、学び合える生涯学習の拠点として設置されています。貸し館事業、各種イベントや学級・講座等の開催、学習グループへの支援、図書室運営等を行っています。 建物は昭和54年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			
				最適化工事	大規模改修		中規模改修
12	岡谷市役所川岸公民館	継続	継続	実施 14,100	31,000		16,000
				地域に根ざし、全ての年齢層にわたる市民等が気軽に集い、学び合える生涯学習の拠点として設置されています。貸し館事業、各種イベントや学級・講座等の開催、学習グループへの支援、図書室運営等を行っています。 建物は昭和53年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			
				最適化工事	大規模改修		中規模改修
13	岡谷市役所長地公民館	継続	継続	実施 14,100	41,000		21,000
				地域に根ざし、全ての年齢層にわたる市民等が気軽に集い、学び合える生涯学習の拠点として設置されています。貸し館事業、各種イベントや学級・講座等の開催、学習グループへの支援、図書室運営等を行っています。 建物は昭和56年に建築していることから長寿命化を図りますが、近隣公共施設の大規模改修等の際には、地域の活動拠点として、幅広く利用できる施設にするための検討を行います。			
				最適化工事	大規模改修		中規模改修

#### ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)										
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
8	岡谷市文化会館	継続	継続				大規模改修							
							400,000							
										劣化度調査				
9	岡谷市勤労青少年ホーム	検討	検討	方向性の検討・決定										
10	生涯学習館	継続	継続	岡谷市イルフプラザのスケジュールに準じます。										
											劣化度調査			

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
11	岡谷市役所湊公民館	継続	継続							大規模改修			
										31,000			
									劣化度調査				
12	岡谷市役所川岸公民館	継続	継続						大規模改修				
									31,000				
									劣化度調査				
13	岡谷市役所長地公民館	継続	継続									大規模改修	
												41,000	
									劣化度調査				

### 3. 子育て支援施設

#### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
14	子育て支援館【こどものくに】	1,130.00	※イルプラザ内	平成8年	28	I	59.3	50.2
15	岡谷市立あやめ保育園	1,380.43	RC造	平成15年	21	I	58.5	58.4
16	岡谷市立みなと保育園	1,023.12	W造	平成17年	19	III	57.7	48.9
17	岡谷市立神明保育園	894.07	S造・W造	平成20年	16	I	65.7	59.7
18	岡谷市立西堀保育園	1,064.06	W造	令和2年	9	II	71.6	54.2
19	岡谷市立小口保育園	905.71	RC造・W造	昭和37年	62	IV	42.8	51.6
20	岡谷市立今井保育園	1,252.87	RC造	昭和54年	45	IV	48.3	45.4
21	岡谷市立川岸保育園	1,134.80	RC造	昭和58年	41	I	52.3	58.5
22	岡谷市立夏明保育園(休園)	331.42	W造	昭和29年	70	IV	35.2	24.0
23	岡谷市立成田保育園	844.40	RC造・W造	昭和32年	67	II	41.7	50.9
24	岡谷市立長地保育園	1,207.75	RC造	昭和57年	42	II	48.8	53.8
25	岡谷市立若草保育園(休園)	718.89	W造	昭和39年	60	-	37.2	-
26	岡谷市立横川保育園	811.46	W造	昭和47年	52	II	41.7	53.1
27	岡谷市立つるみね保育園(閉園)	955.65	W造	昭和51年	48	-	42.7	-
28	岡谷市立岡谷田中小学校学童クラブ	338.10	W造	平成27年	9	-	70.0	-
29	岡谷市立神明小学校学童クラブ	153.49	W造・校舎内	昭和45年	54	-	40.5	-
30	岡谷市立長地小学校学童クラブ	267.30	W造	平成23年	13	-	67.7	-
31	岡谷市立小井川小学校学童クラブ	206.55	W造・校舎内	昭和51年	48	-	42.7	-
32	岡谷市立川岸小学校学童クラブ	124.65	※校舎内	-	-	-	43.5	-
33	岡谷市立上の原小学校学童クラブ	85.00	※校舎内	-	-	-	47.9	-
34	岡谷市立湊小学校学童クラブ	80.65	※校舎内	-	-	-	44.0	-
35	岡谷市障がい児学童ひかりクラブ	-	W造	-	-	-	-	-

※神明小学学童クラブの延床面積は、単独(91.09㎡)と校舎併設(62.40㎡)の合計

※小井川小学学童クラブの延床面積は、単独(114.07㎡)と校舎併設(92.48㎡)の合計

※校舎に併設されている川岸、上の原、湊小学学童クラブは学校の情報により評価を行っています。

※障がい児学童ひかりクラブは岡谷田中小学校学童クラブに併設されています。

#### (2) 施設の主な役割と現状・課題

##### 【子育て支援館】

子育て支援館は、中心市街地活性化を目的に中央町の商業施設を再生・活用した施設のひとつであり、子育て支援の拠点施設としてイルプラザ4階の公共床を改修して、平成15年(2003年)3月に開設しました。

岡谷市イルプラザ条例(平成14年岡谷市条例第32号)に基づく子育て支援施設では、“こどものくに”を愛称に0歳から3歳までの親子がいつでも気軽に来館でき、親子が自由に交流し、のびのびと遊ぶ場を提供しているほか、子育てに関する各種講座や育児相談等、愛情あふれる親子の関係づくりを支援しています。今後も幼年児童全体の減少や3歳未満児の保育所利用率の増加が予想されますが、子育て支援に必要な施設であるため、引き続き安全に利用できるよう、施設の適正な維持管理が必要となります。

## 【保育園等】

本市には、休園中の2園を含め12園の公立保育園があり、通常保育のほか、未満児保育、長時間保育、障がい児保育、一時保育、休日保育等のさまざまな保育サービスを実施しています。少子化や核家族化といった社会情勢の変化に対応しながら、多様化する保護者のニーズを捉えた保育環境の充実に努める必要があります。

また、岡谷市保育園整備計画に基づき、保護者の就労形態に左右されない幼稚園と保育園機能をあわせ持つ「幼保連携型認定こども園」への移行を基本とした環境整備を目指し、統合・再編を含めた計画的な施設配置や整備に努める必要があります。現在、令和5年（2023年）2月に策定した「川岸学園構想」に基づき、川岸地区4園を統合した「幼保連携型認定こども園」の整備を進めており、令和10年4月の開園を予定しています。

なお、統合、再編により閉園となる保育園について、民間活力の導入なども調査しながら、利活用の検討を進めてまいります。

## 【学童クラブ】

学童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や学校休業日に生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的に設置しています。

本市には、小学校7校に学童クラブがあり、校内の単独施設または余裕教室を転用して運営をしています。学童施設は校舎と一体の場所が多いため、施設整備については、学校施設の整備と併せて検討する必要があります。

## （3）施設の具体的な方向性・対策の内容等

### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
14	子育て支援館	継続	継続	岡谷市イルプラザのスケジュールに準じます。			
				子育て支援施設では、“こどものくに”を愛称に0歳から3歳までの親子がいつでも気軽に来館でき、親子が自由に交流し、のびのびと遊ぶ場を提供しているほか、子育てに関する各種講座や育児相談等、愛情あふれる親子の関係づくりを支援しています。 機能は「岡谷市イルプラザ」内にあるため、岡谷市イルプラザの方向性に準じます。			
15	岡谷市立あやめ保育園	継続	継続		中規模改修	大規模改修	
					26,000	228,000	
16	岡谷市立みなと保育園	継続	継続	維持工事		大規模改修	
				実施 7,700		169,000	
16				保護者の多様なライフスタイルを踏まえ、通常保育のほかに、未満児保育、長時間保育、障がい児保育等の様々な保育サービスを実施しています。 みなと保育園は平成17年に建設され老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
17	岡谷市立神明保育園	継続	継続		中規模改修		大規模改修
					18,000		148,000
保護者の多様なライフスタイルを踏まえ、通常保育のほかに、未満児保育、長時間保育、障がい児保育等の様々な保育サービスを実施しています。 神明保育園は平成20年に建設(大規模改修)されており、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。							
18	岡谷市立西堀保育園	継続	継続			中規模改修	
						31,000	
保護者の多様なライフスタイルを踏まえ、通常保育のほかに、未満児保育、長時間保育、障がい児保育等の様々な保育サービスを実施しています。 西堀保育園は令和2年12月に建設された市内で最も新しい園舎です。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。							
19   27	その他市立保育園	－	－	保育園整備計画に準じます。			
保護者の多様なライフスタイルを踏まえ、通常保育のほかに、未満児保育、長時間保育、障がい児保育等の様々な保育サービスを実施しています。 上記4園以外の保育園は、土地が狭く、接する道路の状況や交通の安全面等の課題を抱えていることから、岡谷市保育園整備計画において、新たな建設地を検討しながら、目指すべき保育園の実現と、適正配置に向け、再編にも取り組みます。 なお、川岸学園整備事業に伴い、川岸保育園、成田保育園、夏明保育園(休園)、つるみね保育園(閉園)の今後の利活用について、民間活力の導入も検討しながら、今後の方向性を決定します。							
28   35	学童クラブ	－	－	魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)に準じます。			
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や学校休業日に生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的に設置しています。 学童施設は校舎と一体の場所が多いため、施設整備については、学校施設の整備と併せて検討する必要があることから、令和6年2月に策定した「魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)」による学校整備の方向性に準じます。							

※その他私立保育園および学童クラブは各施設の計画に準ずるため、本計画での評価は行いません。

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)										
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
14	子育て支援館	継続	継続			岡谷市イルプラザのスケジュールに準じます。								
									劣化度調査					
15	岡谷市立あやめ保育園	継続	継続							中規模改修				
										26,000				
									劣化度調査					
16	岡谷市立みなと保育園	継続	継続											
									劣化度調査					
17	岡谷市立神明保育園	継続	継続			中規模修繕								
						18,000								
									劣化度調査					
18	岡谷市立西堀保育園	継続	継続											
									劣化度調査					
19   27	その他市立保育園	継続	継続	保育園整備計画に準じます。										
									劣化度調査					
28   35	学童クラブ	継続	継続	魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)に準じます。										
									劣化度調査					

#### 4. 学校教育系施設

##### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
36	岡谷市立川岸小学校	9,833.82	RC造・S造	昭和53年	45	—	43.5	—
37	岡谷市立神明小学校	7,437.51	RC造・S造他	昭和41年	57	—	47.5	—
38	岡谷市立小井川小学校	7,403.42	RC造・S造他	昭和45年	56	—	39.8	—
39	岡谷市立岡谷田中小学校	7,825.22	RC造・S造	昭和54年	41	—	52.4	—
40	岡谷市立湊小学校	4,255.64	RC造	昭和48年	51	—	44.0	—
41	岡谷市立長地小学校	9,650.73	RC造・S造	昭和58年	45	—	50.4	—
42	岡谷市立上の原小学校	7,204.49	RC造	昭和51年	50	—	47.9	—
43	岡谷市立岡谷西部中学校	9,217.82	RC造	昭和33年	29	—	57.4	—
44	岡谷市立岡谷北部中学校	10,404.64	RC造	昭和57年	37	—	53.2	—
45	岡谷市立岡谷南部中学校	7,298.29	RC造・S造	昭和63年	32	—	54.3	—
46	岡谷市立岡谷東部中学校	10,049.44	RC造・S造他	昭和39年	50	—	52.0	—
47	間下教員住宅(2号棟)	996.12	RC造	平成8年	28	I	55.2	56.1
	間下教員住宅(1号棟)	1,035.12	RC造	平成9年	27	I	55.2	56.1

##### (2) 施設の主な役割と現状・課題

###### 【小中学校】

岡谷市内に居住する児童生徒に義務教育を行うことを目的に設置しています。本市の学校施設は、小学校7校、中学校4校を有し、このうち約8割が建設後30年以上経過し老朽化が進んでいます。

学校施設の適切な維持管理、安全・安心の学習環境の確保、施設の耐震化、長寿命化など計画的な施設整備と、少子化、人口減少社会に対応した魅力と活力ある学校づくりを推進するため、岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プランのハード整備版（岡谷市学校施設等長寿命化計画）に基づき、学校施設の効率的な維持保全に努める必要があります。

現在、令和5年（2023年）2月に策定した「川岸学園構想」に基づき、川岸小学校の長寿命化に向けた大規模改修工事を進めるとともに、同じ敷地内にある岡谷西部中学校とはつなぐ接続施設の新築を進め、令和9年（2027年）4月に9年制の義務教育学校として開校を予定しています。

###### 【間下教員住宅】

間下教員住宅は教員用住宅として平成8年（1996年）、平成9年（1997年）に2棟建設され、運営しています。

建築後20年以上経過し老朽化が進んでいることから、間下教員住宅の長寿命化に向けた計画的な予防保全に努める必要があります。

### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
36   46	市立小中学校	－	－	魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)に準じます。			
	岡谷市内に居住する児童生徒に義務教育を行うことを目的に設置されています。本市の学校施設は、小学校7校、中学校4校を有し、このうち約8割が建設後30年以上経過しています。令和6年2月に策定した「岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)」に基づき、学校施設の効率的な維持保全の実現に向け、市内通学区域の見直しを含めた、小中学校の適正な配置のあり方等を踏まえ、学校施設等の長寿命化計画を推進します。						
47	教員住宅	－	－	魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)に準じます。			
	間下教員住宅は教員用住宅として平成8年(1996年)、平成9年(1997年)に建設され、2棟があります。令和6年2月に策定した「岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン(ハード整備版)」に基づき、施設の長寿命化計画を推進します。						

※市立小中学校および教員住宅は各施設の計画に準ずるため、本計画での評価は行いません。

#### ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
36   46	市立小中学校	継続	継続										
47	教員住宅	継続	継続										

## 5. 供給処理施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
48	樋沢一般廃棄物最終処分場	192.39	RC造	昭和55年	44	－	－	－

※樋沢一般廃棄物最終処分場は市内唯一の供給処理施設であり、比較対象施設がないことから一次評価は行いません。

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【樋沢一般廃棄物最終処分場】

樋沢一般廃棄物最終処分場は、ごみの焼却残渣および不燃物を埋立処分するため昭和56年（1981年）に開設し、平成12年（2000年）に再構築されました。処分場から発生した浸出水は、水処理を行った後、当初は河川放流していましたが、平成24年（2012年）4月からは下水道へ放流しています。現在は、岡谷市の埋立ごみのみ処分しています。

### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
48	樋沢一般廃棄物 最終処分場	継続	継続		大規模改修		中規模改修
					10,000		6,000
	樋沢一般廃棄物最終処分場は、ごみの焼却残渣及び不燃物を埋立処分するため昭和56年(1981年)に開設し、平成12年(2000年)に再構築されました。処分場から発生した浸出水は、当初水処理を行い河川放流していましたが、平成24年(2012年)4月から下水道へ放流しています。 適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。						

#### ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
48	樋沢一般廃棄物 最終処分場	継続	継続									大規模	
												10,000	
									劣化度調査				



### (1) 施設別状況および評価

## （２）施設の主な役割と現状・課題

建設から30年以上が経過している施設が大半を占めており、老朽化が進行していることから、岡谷市営住宅長寿命化計画に基づき管理戸数の削減と適正管理を行っています。

## ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

※市営住宅長寿命化計画に準ずるため、本計画での評価は行いません。

## 31

## 7. 公園施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
65	鳥居平やまびこ公園	3,342.65	RC造	昭和60年	39	Ⅲ	50.4	60.0
66	鶴峯公園(岡谷市鶴峯会館／廃止)	66.10	W造	昭和63年	36	－	－	－
67	塩嶺御野立公園(岡谷市塩嶺閣／廃止)	555.38	RC造	昭和54年	45	－	45.8	－

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【鳥居平やまびこ公園】

子どもからお年寄りまですべての人々が一緒に利用できる「ファミリーパーク」であり、レクリエーション、遊び、運動とつどい、出会い、さらには都市景観等の拠点となることを目的とし昭和58年(1983年)に設置されました。園内には、センターハウスをはじめ、さまざまな施設があり年間約12万人の利用者があります。

#### 【鶴峯公園(岡谷市鶴峯会館)】

市花であるツツジが30種3万株あまり全園を埋め尽くし、中部日本一のツツジの名所として知られ、毎年つつじ祭りには30万人近い人出があります。鶴峯会館は市営休憩所として昭和63年(1988年)に再建されてから36年が経過し、建物の老朽化とともに市民ニーズの変化による施設利用も減少したことから令和6年度をもって廃止しました。

#### 【塩嶺御野立公園(岡谷市塩嶺閣)】

八ヶ岳中信高原国定公園内に位置し、四季折々のすぐれた自然に恵まれ「小鳥の森」に指定され小鳥の楽園とも呼ばれています。また園内では、毎年「塩嶺御野立記念祭」が塩尻市と本市の間で開催されています。塩嶺閣は野外趣味活動施設として昭和54年(1979年)に建設されてから45年が経過し、建物の老朽化とともに市民ニーズの変化による施設利用の減少と、施設機能としての効果も見込めないため令和6年度をもって廃止しました。

### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
65	鳥居平やまびこ公園	—	—	岡谷市公園施設長寿命化計画に準じます。			
	子供からお年寄りまですべての人々が一緒に利用できる「ファミリーパーク」であり、レクリエーション、遊び、運動とつどい、出会い、さらには都市景観等の拠点となることを目的とし昭和58年(1983年)に設置され、年間約12万人の利用者があります。 「岡谷市公園施設長寿命化計画」による長寿命化を行います。						

※鳥居平やまびこ公園は公園施設長寿命化計画に準ずるため、本計画での評価は行いません。

No.	施設名称	—		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
66	鶴峯公園 (岡谷市鶴峯会館)	検討	検討	方向性検討・決定			
	市花であるツツジが30種3万株あまり全園を埋め尽くし、中部日本一のツツジの名所として知られ、毎年つつじ祭りには30万人近い人出があります。鶴峯会館は市営休憩所として昭和63年(1988年)に再建されてから31年が経過しています、利用率の低さを踏まえ施設の老朽化を勘案しながら必要性を検討し、第1期計画期間において今後の方向性を決定します。						
	鶴峯公園 (岡谷市鶴峯会館)	廃止	除却	廃止・除却			
【検討結果】 建築から36年が経過し、建物が老朽化していることや、市民ニーズの変化により施設の利用実績も低く、今後の増加も見込めないことから令和6年度で廃止とし、令和7年度に除却します。							
67	塩嶺御野立公園 (岡谷市塩嶺閣)	検討	検討	方向性検討・決定			
	ハケ岳中信高原国定公園内に位置し、四季折々のすぐれた自然に恵まれ「小鳥の森」に指定され小鳥の楽園とも呼ばれています。野外趣味活動施設として昭和54年(1979年)に建設されてから40年が経過しています。「小鳥バス」での利用に意を配しつつも利用率の低さを踏まえ、施設の老朽化を勘案しながら必要性を検討し、第1期計画期間において今後の方向性を決定します。						
	塩嶺御野立公園 (岡谷市塩嶺閣)	廃止	検討	廃止	施設検討		
【検討結果】 建築から45年が経過し、建物が老朽化していることや、市民ニーズの変化により施設の利用実績も低く、今後の増加や施設機能としての利用効果は見込めないことから令和6年度で廃止とする。建物については利活用の可能性、または除却について検討します。							

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:修繕費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
65	鳥居平やまびこ公園	継続	継続				岡谷市公園施設長寿命化計画に準じます。						
									劣化度調査				
66	鶴峯公園 (岡谷市鶴峯会館)	—	—										
67	塩嶺御野立公園 (岡谷市塩嶺閣)	—	検討	施設の検討									

## 8. 産業系施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
68	テクノプラザおかや	2,171.77	RC造	平成13年	23	Ⅲ	55.8	49.4
69	岡谷市勤労会館	637.43	RC造	昭和57年	42	Ⅲ	49.7	50.7
70	岡谷市イルフプラザ	9,632.88	RC造	平成9年	27	Ⅲ	53.3	32.9
71	岡谷市中央町アミューズメント施設	2,873.07	※中央町駐車場併設	平成9年	27	I	55.7	57.0
72	岡谷太鼓道場	1,273.34	RC造	昭和47年	52	I	43.4	45.1
73	岡谷市中央町駐車場	14,782.37	RC造・S造	平成9年	27	I	59.3	57.7
74	岡谷市駅前自転車駐車場	1,934.50	S造	平成10年	26	Ⅲ	58.2	45.7
75	ラオカヤ(廃止)	20,639.33	RC造	昭和59年	40	-	41.6	-

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【テクノプラザおかや】

平成14年(2002年)に、工業振興の拠点施設として開設され、市内企業の製品展示、企業間の情報交換の場の提供を行い、市内企業の活性化に努めています。

また、工業振興課による各種工業振興施策の推進(セミナー等の開催)や中小企業経営相談所を開設し、専門員による経営技術相談を行っているほか、令和3年(2021年)にコワーキングスペースを開設し、リモートワークやワーケーションなどの多様な働き方に対応した環境整備を行っています。

建物は平成13年(2001年)に建築され、設備等の老朽化が進んできていることから計画的な施設整備を行うこととし、空調設備や照明設備等の計画的な更新についても、段階的に取り組んでいます。

#### 【岡谷市勤労会館】

働く市民の福祉の増進と文化の向上に寄与することを目的として、昭和57年(1982年)に開設されました。営利・非営利を問わず様々な用途に活用できる施設です。

昭和57年(1982年)に建築しており老朽化が進行しています。

#### 【岡谷市イルフプラザ】

岡谷市イルフプラザ条例(平成14年11月6日岡谷市条例第32号)に基づき、中心市街地の活性化およびにぎわいの創出に寄与し、並びにライフステージに応じた生涯学習の機会および親子のふれあいの場を支援することを目的に設置されています。市の中心に位置する賑わいの核となるビルであり、市民がだれでも集い、交流できるふれあいの場として、また回遊性、集客性のある施設として、1・2階は商業施設、3・4階は主に公共施設とした複合施設です。

平成9年(1997年)に建築しており老朽化が進行していることから計画的な施設整備を行っています。

#### 【岡谷市中央町アミューズメント施設】

岡谷市中央町アミューズメント施設は、岡谷市中央町アミューズメント施設条例（平成9年3月31日岡谷市条例第17号）に基づき、市民生活の向上と地域経済の発展に寄与し、市民の健全な余暇活力の増進に資することを目的に設置されています。子どもから高齢者まで、市民がだれでも集い、交流し、利用できる飲食店や娯楽施設の機能をもつ施設です。

また、令和5年（2023年）におかやシェアオフィスを開設し、働き方や働く場所の多様化への対応のほか創業支援とするための環境整備を行っています。

平成9年（1997年）に建築しており老朽化が進行していることから計画的な施設整備を行っています。

#### 【岡谷太鼓道場】

岡谷太鼓道場条例（平成15年岡谷市条例第34号）に基づき、岡谷の観光資源、芸能文化である和太鼓の伝承発展のため、演奏技術の習得や学習指導の推進を図り、太鼓のまちづくりに寄与することを目的とし設置されています。八ヶ岳を望む小高い丘の上にあり、成田公園に面した風光明媚な場所にある施設です。

各練習室は、防音構造、1部壁鏡張り、フローリング構造となっており、太鼓のほかにダンス・舞踊・楽器練習などの利用にも適しています。

昭和47年（1972年）に建築しており、部分的な改修を行っているが老朽化が進行しています。

#### 【岡谷市中央町駐車場】

岡谷市駐車場条例（平成9年岡谷市条例第16号）に基づき、中心市街地の都市機能の確保および市民福祉の増進に寄与することを目的に設置されています。

岡谷市イルフプラザや岡谷市中央町アミューズメント施設の利用者等が使用していますが、市民に限らず誰もが駐車できる施設です。

平成9年（1997年）に建築しており老朽化が進行していることから計画的な施設整備を行っています。

#### 【岡谷市駅前自転車駐車場】

地方自治法および岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例（平成10年12月22日岡谷市条例第35号）に基づき、自転車および原動機付自転車の秩序ある適正な駐車の促進を図ることを目的に設置され、主に通勤通学者が利用していますが、少子化に伴い利用者は減少傾向にあります。施設は3階建ての構造で、自転車と原動機付自転車を駐車することができます。

平成10年（1998年）に建築しており老朽化が進行しています。

## 【ララオカヤ】

駅前再開発ビルとして、昭和 59 年（1984 年）にオープンしました。平成 16 年（2004 年）に市が㈱諏訪バスから権利の約 9 割を取得して以降 1 階に飲食店や小売店舗等が営業し、2 階はイベント広場として一年を通して様々なイベントが随時開催されていました。

施設の老朽化の進行により、市が全ての権利取得を行い、令和 6 年（2024 年）3 月に施設を廃止しました。

## （３）施設の具体的な方向性・対策の内容等

### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
68	テクノプラザおかや	継続	継続	中規模改修		大規模改修	
				実施 42,500		115,000	
				平成14年(2002年)に、工業振興の拠点施設として開設され、市内企業の製品展示や企業間の情報交換の場の提供しています。また、工業振興課による各種工業振興施策の推進(セミナー等の開催)や専門員による経営技術相談を行っているほか、令和3年(2021年)にコワーキングスペースを開設し、リモートワークやワーケーションなどの多様な働き方に対応した施設整備を行っています。今後も岡谷市の工業振興拠点として、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
69	岡谷市勤労会館	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				働く市民の福祉の増進と文化の向上に寄与することを目的として開設され、営利・非営利を問わず様々な用途に活用できる施設です。 建物は昭和57年に建築しており老朽化が進行していますが、大規模改修は困難であるため、利用者と協議の場を設けながら施設の統合(移転・集約)に向けて検討し、今後の方向性を決定します。			
70	岡谷市イルフプラザ	継続	継続	維持工事	中規模改修	大規模改修	
				実施 793,200	200,000	706,000	
				中心市街地の活性化およびにぎわいの創出に寄与し、並びにライフステージに応じた生涯学習の機会および親子のふれあいの場を支援することを目的に、おかや東急百貨店のビルを取得し、平成15年に岡谷市イルフプラザとして再整備されました。商業施設、生涯学習館(カルチャーセンター)および子育て支援館(こどものくに)が入った複合施設となり、中心市街地の賑わい・文化活動の拠点として活用されていることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
71	岡谷市中央町 アミューズメント施設	継続	継続	維持工事	中規模改修	大規模改修	
				実施 51,100	137,000	213,000	
				市民生活の向上と地域経済の発展に寄与し、市民の健全な余暇活力の増進に資することを目的に設置されています。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
72	岡谷太鼓道場	継続	継続	一部除却工事	中規模改修		更新検討
				実施 12,200	31,000		
				岡谷の観光資源、芸能文化である和太鼓の伝承発展のため、演奏技術の習得や学習指導の推進を図り、太鼓のまちづくりに寄与することを目的とし設置されています。ハヶ岳を望む小高い丘の上にあり、成田公園に面した風光明媚な場所にある施設です。岡谷市の太鼓文化の拠点施設として、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
73	岡谷市中央町駐車場	継続	継続	中規模改修		大規模改修	
				実施 65,400		539,000	
				中心市街地の都市機能の確保および市民福祉の増進に寄与するために設置されています。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
74	岡谷市駅前 自転車駐車場	継続	継続			大規模改修	
						103,000	
				駅周辺地域において、自転車および原動機付自転車の秩序ある適正な駐車のを促進を図るため設置されました。3階建ての構造で、自転車と原動機付自転車を駐車することができます。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
75	ラオカヤ	廃止	廃止	廃止			
	駅前再開発ビルとして昭和59年にオープンしました。平成16年に市が(株)諏訪バスから権利の約9割を取得し、現在は1階に飲食店や小売店舗等が営業し、2階はイベント広場として一年を通して様々なイベントが随時開催されています。施設の廃止に向けて、岡谷市以外の権利の取得を行っています。						
	ラオカヤ	廃止	廃止		除却		
	令和6年3月までに市が全ての権利を取得し、施設を廃止しました。第2期計画期間で建物の除却を進めます。						

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
68	テクノプラザおかや	継続	継続										
									劣化度調査				
69	岡谷市勤労会館	検討	検討	方向性検討・決定									
70	岡谷市イルプラザ	継続	継続			中規模改修 200,000							
									劣化度調査				
71	岡谷市中央町 アミューズメント施設	継続	継続					中規模改修 137,000					
									劣化度調査				
72	岡谷太鼓道場	継続	継続							中規模修繕 31,000			
										劣化度調査			
73	岡谷市中央町駐車場	継続	継続										
									劣化度調査				
74	岡谷市駅前 自転車駐車場	継続	継続										
									劣化度調査				
75	ラオカヤ	廃止	除却	解体工事									

## 9. 社会教育系施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
76	市立岡谷蚕糸博物館 【シルクファクトおかや】	2,908.10	RC造、S造	昭和44年	55	I	49.6	49.2
77	日本童画美術館【イルフ童画館】	1,391.07	RC造	平成10年	26	I	55.9	56.8
78	市立岡谷図書館	1,942.71	RC造	昭和54年	45	I	48.7	63.2
79	市立岡谷美術考古館	1,238.85	S造	平成7年	29	III	57.5	45.0
80	岡谷市塩嶺野外活動センター	713.02	RC造	昭和56年	43	III	48.8	34.8
81	生涯学習課分室	800.99	W造	昭和14年	85	-	33.2	-

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【市立岡谷蚕糸博物館】

先人の成し遂げた偉業に学び、ものづくり精神と新たなシルク文化を発信するため、旧蚕糸試験場岡谷製糸試験所（後の（独）農業生物資源研究所）のあった建物に、(株)宮坂製糸所を併設した施設として、平成26年（2014年）に移転設置されました。愛称には、工場の（factory）のイメージとシルクの真実（fact）を伝えたいという意味が込められています。

昭和44年（1969年）に建築した建物であり、移転設置の際に一部改修を行いました。事務棟の大部分が未改修のままで、老朽化が進行しています。

#### 【日本童画美術館】

愛称を「イルフ童画館」として、武井武雄作品を中心に童画作品の展示のほかモーリス・センダックの作品や世界の童画企画展を開催するなど「童画のまちづくり」を推進する拠点施設として設置され、次世代の若手童画家の発掘と支援、育成のため、隔年で日本童画大賞も開催しています。平成10年（1998年）に建築しており、建物、設備等の更新工事を順次行っています。

#### 【市立岡谷図書館】

図書館は図書館法や社会教育法、市立岡谷図書館条例（昭和26年岡谷市条例第22号）等に基づき、図書その他の資料を中心とする諸活動によって、市民の教育、文化、調査研究、レクリエーション等に資するため設置されました。

同館は図書を貸し出すだけでなく、地域の行政や住民の自立的な判断を支える情報提供施設であるとともに、住民の読書を推進し、基礎学力や知的水準の向上を図るために欠かせない重要な知的基盤であり、地域の文化や経済社会の発展を支える施設です。昭和54年（1979年）に建築しており老朽化が進行していることから、必要に応じた改修を順次行っています。



### 【市立岡谷美術考古館】

岡谷美術考古館は、平成25年（2013年）に社会教育法及び博物館法並びに市立岡谷美術考古館条例（昭和45年岡谷市条例第21号）に基づき、郷土に関係の深い文化財をはじめ、美術品等の資料を収集及び保管し、調査および研究のうえ、教育的配慮のもとに展示して公衆の利用に供するために、既存の建物をリニューアルして移転設置されました。市民に親しまれる美術考古館として、他館や周辺地区との連携や活性化に寄与し、広く市民に愛され、利用されることを目指しています。平成7年（1995年）に建築しており老朽化が進行しています。

### 【岡谷市塩嶺野外活動センター】

市民が自然に親しみながら野外活動や宿泊体験を通じ、心身の健全な育成を図るための社会教育施設として設置されています。市内の多種多様な団体を中心に実施する様々な事業や活動に利用されており、多様な学びの場を提供するうえで他にはない立地と施設機能を有しています。

昭和56年（1981年）に建築しており老朽化が進行しています。

### 【生涯学習課分室】

旧岡谷高等職業訓練校の建物を平成22年（2010年）から、市内遺跡発掘調査で出土した土器・石器等の保管場所として使用しています。発掘調査で出土した遺物の洗浄作業や整理作業を行い、発掘調査報告書の作成を行っています。

昭和14年（1939年）に建築しており、施設としての寿命を迎える時期にきています。

## （3）施設の具体的な方向性・対策の内容等

### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
76	市立岡谷蚕糸博物館	継続	継続		中規模改修		更新検討
					99,000		
				先人の成し遂げた偉業に学び、ものづくり精神と新たなシルク文化を発信するため、旧蚕糸試験場岡谷製糸試験所(後の(独)農業生物資源研究所)のあった建物に、(株)宮坂製糸所を併設した施設として平成26年(2014年)に移転設置されました。移転設置の際に一部改修を行いました但し長期的に老朽化が進行しています。成長する施設として、計画的な改修計画による長寿命化を図ります。			
77	日本童画美術館	継続	継続	中規模改修		大規模改修	
				実施 37,000		102,000	
				愛称を「イルフ童画館」として、武井武雄作品を中心に童画作品の展示のほか、モーリス・センダックの作品や世界の童画企画展を開催するなど「童画のまちづくり」を推進する拠点施設として、平成10年(1998年)に設置されました。次世代の若手童画家の発掘と支援、育成のため、隔年で日本童画大賞も開催しています。施設の老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
78	市立岡谷図書館	継続	継続	維持工事	大規模改修		中規模改修
				実施 5,400	133,000		68,000
				図書やその他の資料を収集、整備、保存して、市民の教育、文化、調査研究、レクリエーション等のために提供することを目的として設置されています。同館は図書を貸し出すだけでなく、情報提供施設であるとともに、住民の読書を推進し、基礎学力や知的水準の向上を図るための重要な知的基盤であり、地域の文化や経済社会の発展を支える施設です。昭和54年に建築しており老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
79	市立岡谷美術考古館	継続	継続	最適化工事	大規模改修		中規模改修
				実施 9,800	73,000		44,000
				岡谷市の文化財産、特に美術作品・考古資料などを収集・保存・展示する目的に、昭和45年(1970年)に設置されましたが、平成25年(2013年)には「文化を核にしたまちづくり」の拠点となる施設をめざし、童画館通りに移転設置され、岡谷市の文化と芸術を伝える空間として、市民の皆様の芸術の窓口となるように様々な企画展示やイベントを行っています。移転設置の際に一部改修を行い予防保全工事は完了しています。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
80	岡谷市塩嶺野外活動センター	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				市民が自然に親しみながら野外活動や宿泊体験を通じ、心身の健全な育成を図るための社会教育施設として設置されています。市内の多種多様な団体を中心に実施する様々な事業や活動に利用されており、多様な学びの場を提供するための機能を有しておりますが、今後の利用状況や利用者ニーズを検証するとともに、機能の分散化についての協議を継続し、第2期計画期間において今後の方向性を決定します。 昭和56年に建築しており老朽化が進行していることから、一定規模の改修の必要が生じた際は、廃止を含めて判断します。			
81	生涯学習課分室	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				旧岡谷高等職業訓練校の建物を平成22年(2010年)から、市内遺跡発掘調査で出土した土器・石器等の保管場所として使用しています。発掘調査で出土した遺物の洗浄作業や整理作業を行い、発掘調査報告書の作成を行っています。昭和14年の建築であるため老朽化が顕著であり、建物の寿命を迎えることから、他の公共施設の集約・統廃合に併せて移転を検討し、第2期計画期間において今後の方向性を決定します。			

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
76	市立岡谷蚕糸博物館 【シルクファクトおかや】	継続	継続				中規模修繕						
							63,000				37,000		
									劣化度調査				
77	日本童画美術館 【イルフ童画館】	継続	継続										
									劣化度調査				
78	市立岡谷図書館	継続	継続							大規模改修			
										133,000			
									劣化度調査				
79	市立岡谷美術考古館	継続	継続										大規模修繕
													73,000
									劣化度調査				
80	岡谷市塩嶺野外活動センター	検討	検討	方向性の検討・決定									
									劣化度調査				
81	生涯学習課分室	検討	検討	移転先の検討・決定									
									劣化度調査				

## 10. スポーツ・レクリエーション系施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
82	市営岡谷球場	669.00	RC造	昭和24年	75	Ⅱ	38.2	49.8
83	岡谷市民総合体育館	9,063.97	RC造	昭和55年	49	Ⅲ	53.1	50.4
84	岡谷市民水泳プール	3,418.04	RC造	昭和55年	44	Ⅳ	45.3	49.8
85	岡谷市やまびこ国際スケートセンター	2,834.91	RC造	平成6年	30	Ⅳ	44.3	37.1
86	岡谷市やまびこアリーナ	5,120.15	RC造	平成6年	30	—	55.8	—
87	岡谷市民川岸スポーツ広場	116.33	RC造	平成8年	28	I	52.6	53.1
88	岡谷市営庭球場	243.51	RC造	昭和60年	39	I	49.9	65.9
89	岡谷市営陸上競技場	30.80	S造	平成9年	27	Ⅲ	52.9	43.6
90	岡谷市民湖畔広場	—	—	—	—	—	—	—

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【市営岡谷球場】

両翼 92m、センター122mのグラウンドであり、軟式野球およびソフトボール競技に利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、休日には市民大会をはじめ、全国大会に至るまで多くの大会が開催されています。また、照明施設が整備されていることから、夜間の利用も可能となっています。

昭和24年（1949年）に建築しており老朽化が進行していることから、今後の方向性について検討する必要があります。

#### 【岡谷市民総合体育館】

西体育館（スワンドーム）、東体育館、柔剣道場、弓道場、トレーニングルーム、会議室等を備え、様々な屋内競技に利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、休日には多種多様なスポーツ大会やイベントが開催されています。

昭和55年（1980年）に建築しており老朽化が進行していることから、大規模改修を行っています。

#### 【岡谷市民水泳プール】

屋内に（公財）日本水泳連盟公認 25mプール 9コース、幼児プール、徒歩プール、スライダープール、屋外には幼児用変形プールを備え、目的に応じた利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、競技力向上及び健康増進、親子等の触れ合いの場として、また、子どもたちが楽しめる施設として利用されています。

昭和55年（1980年）に建築しており老朽化が進行していることから、大規模改修を行っています。

#### 【岡谷市やまびこ国際スケートセンター】

国際公認 400mパイピングリンクであり、近代スケート発祥地の歴史と文化を将来に引き継ぐための中核を担う施設です。

子どもから大人まで、また初心者からトップアスリートまで、様々な目的で利用されています。

平成 6 年（1994 年）に建築しており老朽化が進行しています。

#### 【岡谷市やまびこアリーナ】

国際公認パイピングリンクであり、アイスホッケー、フィギュア、ショートトラック、カーリングなど、アイススケート場として利用可能な施設です。

子どもから大人まで、それぞれの目的に応じた利用がされています。

また、平成 28 年（2016 年）3 月よりパラリンピック競技のパラアイスホッケーナショナルトレーニングセンター強化拠点施設に指定されています。

平成 6 年（1994 年）に建築しており老朽化が進行していることから、計画的な改修を行っています。

#### 【岡谷市民川岸スポーツ広場】

バックネットが 2 ヶ所に設置されているグラウンドであり、少年野球およびソフトボール、サッカーに利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、休日には多種多様なスポーツ大会やイベントが開催されています。また、照明施設が整備されていることから、夜間の利用も可能となっています。

建物はトイレおよび倉庫がありますが、平成 8 年（1996 年）に建築しており老朽化が進行しています。

#### 【岡谷市営庭球場】

砂入人工芝コート 6 面およびクレイコート 6 面の合計 12 面が利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、休日には大会が開催されています。また砂入人工芝コートには照明施設が整備されていることから、夜間の利用も可能となっています。

昭和 60 年（1985 年）に建築しており老朽化が進行していることから、計画的な改修を行っています。

#### 【岡谷市営陸上競技場】

岡谷東部中学校の校庭を活用して、関係団体による陸上教室や春秋には市民陸上大会が開催されています。

（公財）日本陸上競技連盟公認第 4 種陸上競技場は、令和 4 年（2022 年）10 月 9 日の公認期間満了を以って公認更新は行わないこととし、市営陸上競技場としての機能を維持しています。

## 【岡谷市民湖畔広場】

バックネットが2ヶ所に設置されているグラウンドであり、軟式野球、サッカー等、多種目にわたり利用可能な施設です。

子どもから大人まで多くの利用があり、休日には多種多様なスポーツ大会やイベントが開催されています。

## (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:修繕種別・下段:修繕費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
82	市営岡谷球場 (管理棟)	検討	検討	維持工事	施設の検討・決定		
				実施 2,000			
子どもから大人まで多くの利用があり、休日には大会やイベントが開催されています。 管理棟の老朽化が進行しており、目標耐用年数を迎えることから、管理棟施設のあり方について検討します。							
83	岡谷市民総合体育館	継続	継続	大規模改修(西・東体)		中規模改修(西・東体)	更新検討(東体)
				実施 698,000		237,000	
様々な屋内競技に利用可能な施設であることから、子どもから大人まで多くの利用があり、休日には大会やイベントが開催されています。 施設の利用状況、経費等を見極めながら、適切な維持管理および計画的な改修を行い、長寿命化を図ります。							
84	岡谷市民水泳プール	継続	継続	大規模改修		中規模改修	
				実施 257,300		66,000	
目的に応じて利用可能な施設であることから、子どもから大人まで多くの利用があり、競技力向上および健康増進、親子等の触れ合いの場として、また、子どもたちが楽しめる施設として利用されています。 適切な維持管理および計画的な改修を行い、長寿命化を図ります。							
85	岡谷市やまびこ国際 スケートセンター	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				維持工事			
				実施 5,000			
近代スケート発祥地の歴史と文化を将来に引き継ぐための中核を担う施設として、子どもから大人まで、また初心者からトップアスリートまで多くの利用があり、休日には大会やイベントが開催されています。 令和10年に県内で開催予定の国民スポーツ大会等に対する機運醸成を踏まえ、令和10年まで施設管理を行うこととし、存廃等に向けた検討を継続します。なお、大規模改修の必要が生じた際は、廃止を含め検討します。							
86	岡谷市やまびこアリーナ	継続	継続	大規模改修			中規模改修
				実施 14,800			90,000
アイススケート場として、子どもから大人までそれぞれの目的に応じた利用があり、休日には大会やイベントが開催されています。 適切な維持管理および計画的な改修を行い、長寿命化を図ります。							
87	岡谷市民川岸 スポーツ広場	継続	継続			大規模改修	
						7,000	
子どもから大人まで多くの利用があり、休日には多種多様な大会やイベントが開催されています。 上記に記載したスケジュールは建物(倉庫等)に関するものであり、グラウンド基面整備等は、状況に応じ改修工事を行います。							
88	岡谷市宮庭球場	継続	継続	維持工事	大規模改修		中規模改修
				実施 59,950	14,000		10,000
子どもから大人まで多くの利用があり、休日には大会やイベントが開催されています。 上記に記載したスケジュールは建物(管理棟)に関するものであり、コート基面整備等は、状況に応じ改修工事を行います。							

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:修繕種別・下段:修繕費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
89	(公財)日本陸上競技連盟 第4種陸上競技場 岡谷市営陸上競技場	検討	検討	方向性検討・決定			
	関係団体による陸上教室や春秋には市民陸上大会が開催されています。 中学校校庭と併用しているため、維持管理に課題が多いため、令和3年度に今後の方向性を決定します。						
	岡谷市営陸上競技場	継続	継続	公認終了			
	【検討結果】 令和4年10月9日の公認期間満了を以て、(公財)日本陸上競技連盟第4種陸上競技場の公認更新は行わないこととしましたが、市営陸上競技場としての機能は維持しています。						
90	岡谷市民湖畔広場	継続	継続				
	子どもから大人まで多くの利用があり、休日には多種多様な大会やイベントが開催されています。 グラウンド基面整備等は、状況に応じ改修工事を行います。 ※広場には建物がないため改修スケジュールへの記載は行いません。						

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
82	市営岡谷球場 (管理棟)	検討	検討	施設の検討・決定									
									劣化度調査				
83	岡谷市民総合体育館	継続	継続						劣化度調査				
84	岡谷市民水泳プール	継続	継続						劣化度調査				
85	岡谷市やまびこ国際 スケートセンター	検討	検討	方向性検討・決定									
									劣化度調査				
86	岡谷市やまびこ アリーナ	継続	継続						劣化度調査				
87	岡谷市民川岸 スポーツ広場	継続	継続						劣化度調査				
88	岡谷市営庭球場	継続	継続							大規模改修			
									劣化度調査	14,000			
89	岡谷市営陸上競技場	継続	継続						劣化度調査				
90	岡谷市民湖畔広場	継続	継続						劣化度調査				

## 1 1. 保健・福祉施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
91	おかや総合福祉センター	6,461.55	RC造	昭和46年	53	I	50.4	50.9
92	旧岡谷市通園訓練施設まゆみ園(移転)	-	-	-	-	-	-	-
93	岡谷市子ども発達支援センター	484.74	RC造	令和2年	9	III	71.9	36.7
94	岡谷市保健センター	1,194.08	RC造	昭和60年	39	I	50.1	51.0
95	岡谷健康福祉施設【ロマネット】	2,181.94	RC造	平成7年	29	I	52.7	62.6

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【おかや総合福祉センター】

温泉施設と生涯学習施設の機能をあわせ持ち、子どもから高齢者まで、市民誰もが集い、交流し、利用できる総合福祉施設として設置されています。「諏訪湖ハイツ」を愛称として、研修施設のほか、大浴場、温泉リハビリ施設、足湯、芝庭、また夏には親子などが水遊びを楽しめる親水池があり、市民福祉の充実および生涯学習の推進の拠点施設となっています。

昭和46年（1971年）に建築され施設の老朽化が進む中、計画的に改修工事や設備の更新を実施し、利用者の安全で安心な利用に努める必要があります。

#### 【旧岡谷市通園訓練施設まゆみ園】

地方自治法（昭和22年法律第67号）及び岡谷市通園訓練施設まゆみ園条例（平成17岡谷市条例第25号）に基づき、心身の発達に支援を必要とする児童の機能訓練、生活指導等を行い、児童の育成を助長することを目的に設置されましたが、令和2年度（2020年度）新たに建設された岡谷市立西堀保育園へ併設された岡谷市子ども発達支援センターへの移転にともない、令和3年（2021年）3月31日に廃止し、令和4年（2022年）10月に土地、建物を売却処分しました。

#### 【岡谷市子ども発達支援センター】

心身の発達に支援を必要とする児童の日常生活における基本動作の指導や知識技能の習得、集団生活に適応するための訓練等を行うことにより、児童の健全な育成を図ることを目的として令和3年4月1日に西堀保育園の2階に併設されました。

療育訓練や生活指導のほか、保護者や家庭へのアドバイス等の支援を行い、悩みを抱える子育て家庭が気軽に相談できる拠点施設となっております。

#### 【岡谷市保健センター】

地方自治法（昭和22年法律第67号）および岡谷市保健センター条例（昭和60年岡谷市条例第6号）に基づき、市民の健康の保持及び増進を図ることを目的に設置されています。

保健センターは、予防接種、乳幼児健診、がん検診等を実施しており、乳幼児から高齢者といった幅広い市民の健康の保持・増進を図る場所となっています。

昭和 60 年（1985 年）に建築しており老朽化が進行していることから、計画的な改修を行っております。

#### 【岡谷健康福祉施設】

「ロマネット」を愛称に、岡谷温泉の恵みを活用し、「健康と保健」「コミュニケーション」「文化」等を有機的に統合し、市民の潤いと活力に満ちた人づくりに貢献することを目的に設置されています。

また、民間の経営手法を活用し、効率的な管理運営を行うことにより経費の削減を図るとともに、質の高いサービスの提供を図るため、市内で唯一の利用料金制を導入している施設であり、日帰り温泉施設として、浴室、サウナ、休憩室、食堂などを備えた施設です。

平成 7 年（1995 年）に建築しており老朽化が進行しています。

### （３）施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
91	おかや総合福祉センター	継続	継続	中規模改修	中規模改修	大規模改修(作業所)	更新検討
				実施 48,600	112,000	18,000	
				市民福祉の充実および生涯学習の推進を目的とする拠点施設として、子どもから高齢者まで、市民だれもが集い、交流し、利用できる生涯学習と福祉の機能をもつ施設として設置されています。昭和46年に建築され老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。			
92	旧岡谷市通園訓練施設 まゆみ園	継続 (移転)	検討	方向性検討・決定			
	心身の発達に支援を必要とする児童の機能訓練、生活指導等を行い、児童の育成を助長することを目的として設置されていましたが、施設機能は令和2年度(2020 年度)に新たに建設された西堀保育園に併設された岡谷市子ども発達支援センターへ移転しました。建物については新たな利用の方向性を売却も含め検討します。						
	旧岡谷市通園訓練施設 まゆみ園		売却				
【検討結果】 令和4年10月12日売買契約にて、障がい福祉サービス事業所を運営する事業者に対し土地及び建物を売却しました。							
93	岡谷市子ども発達支援センター	継続	継続				
				岡谷市立西堀保育園の整備計画に準じます。			
心身の発達に支援を必要とする児童や保護者を対象に療育訓練や生活指導等の支援を行い、児童の健全な育成を図ることを目的に岡谷市市立西堀保育園内に設置されています。悩みを抱える子育て家庭が気軽に相談できる拠点施設として、岡谷市市立西堀保育園の整備計画に準じて長寿命化を図ります。							
94	岡谷市保健センター	継続	継続	最適化工事	大規模改修		中規模改修
				実施 4,200	72,000		42,000
	市民の健康の保持および増進を図るためことを目的として設置されています。適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。						



No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
95	岡谷健康福祉施設	検討	検討	方向性検討・決定	方向性検討・決定		
				「ロマネット」を愛称に、岡谷温泉の恵みを活用し、市民の潤いと活力に満ちた人づくりに貢献することを目的に設置されています。年間約25万人の利用者があり、多くの利用がありますが、温浴施設という施設の性質上、建物の一部に課題があります。今後の岡谷駅周辺整備では、官民連携でまちづくりを進めるための指針となる「岡谷駅周辺まちの将来ビジョン」の対象区域に、健康福祉施設を含む諏訪湖畔エリアを対象として位置づけていることを踏まえ、引き続き民間活力の活用も含め、第2期計画期間において今後の方向性を決定します。なお、計画期間中は現行機能を維持することとし、大規模改修の必要が生じた際は休廃止を含め検討します。			

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:改修費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
91	おかや総合福祉センター	継続	継続						中規模修繕				
									112,000				
									劣化度調査				
92	旧岡谷市通園訓練施設 まゆみ園	—	—										
93	岡谷市子ども発達支援センター	継続	継続				岡谷市立西堀保育園の整備計画に準じます。						
									劣化度調査				
94	岡谷市保健センター	継続	継続								大規模改修		
											72,000		
									劣化度調査				
95	岡谷健康福祉施設	検討	検討	方向性の検討・決定									
									劣化度調査				

## 1 2. 文化財施設

### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
96	旧岡谷市役所庁舎	1,968.79	RC造	昭和10年	89	-	-	-
97	旧林家住宅	1,195.78	W造	明治26年	131	-	-	-
98	旧渡辺家住宅	148.92	W造	1750年代	-	-	-	-
99	旧山一林組製糸事務所	788.65	W造	大正10年	103	-	-	-

※文化財施設は建築から80年以上経過しており、目標耐用年数を超過しているため、一次評価は行いません。

### (2) 施設の主な役割と現状・課題

#### 【旧岡谷市役所庁舎】

昭和 11 年（1936 年）4 月の市制施行に合わせて、製糸家の尾澤福太郎氏より市役所庁舎として寄贈されたものです（同年 2 月竣工）。ランドマークにふさわしい風格は今なお変わらず、名実ともに市のシンボルとして、市民から愛着を寄せられています。現在の市役所庁舎へ移転した昭和 62 年（1987 年）から平成 26 年（2014 年）までは、消防庁舎として利用されてきました。また、昭和初期の貴重な建造物として、平成 17 年（2005 年）に国登録有形文化財に登録され、平成 19 年（2007 年）には近代化産業遺産に認定されています。建設から長年が経過し老朽化が進行していますが、歴史ある重要な建物であるため、今後も適正な維持管理により良好な状態で後世へ受け継いでいきます。

#### 【旧林家住宅】

明治の終わりに建てられ、岡谷市の製糸業発展の基を築いた三大製糸家の一人林国蔵の居宅であり、木造切妻造 2 階建ての主屋と、洋館が併設された離れ、土蔵などの 6 棟からなります。全国的にも希少価値の高い壁紙である「金唐革紙」が使われている離れ 2 階和室をはじめ、立川流の彫刻師による欄間や仏壇の彫刻などが特長となっています。（国重要文化財指定）

#### 【旧渡辺家住宅】

諏訪高島藩に仕えた在郷の村に住む中下級武士の家で、全国的にも貴重とされています。現存する武士の家が全国的に少なくなった今、これを後世に伝えるため、平成 3 年（1991 年）より一般公開し保存・活用しています。解体復元修理の際に、襖の下貼から 3,000 枚を超す江戸時代の手紙や絵等の文書が発見され、当時を知る貴重な資料となっています。（長野県宝）

#### 【旧山一林組製糸事務所】

大正 10 年（1921 年）建築の山一林組製糸の事務所で、昭和 2 年（1927 年）に起きた「山一争議」の歴史的舞台となりました。平成 17 年に隣接する守衛所とともに国登録有形文化財になり、平成 19 年（2007 年）には近代化産業遺産群にも認定されています。現在建物内に「岡谷絹工房」が入り、観光客等を対象に岡谷絹の絹織り見学・体験が可能で、各種絹製品も販売しています。

### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
96	旧市役所庁舎	継続	保存		適正な維持管理により保存		
				昭和11年(1936年)に製糸家の尾澤福太郎氏より市役所庁舎として寄贈されたものです。現在の市役所庁舎へ移転した昭和62年(1987年)から平成26年(2014年)までは、消防庁舎として利用されてきました。今後は、登録有形文化財でもある歴史ある重要な建物であるため、適正な維持管理により良好な状態で後世へ受け継いでいきます。			
97	旧林家住宅	継続	保存		適正な維持管理により保存		
				明治の終わりに建てられた三大製糸家の一人林国蔵の居宅であり、木造切妻造2階建ての主屋と、洋館が併設された離れ、土蔵などの6棟からなります。全国的にも希少価値の高い壁紙である「金唐革紙」が使われている離れ2階和室をはじめ、立川流の彫刻師による欄間や仏壇の彫刻などが特長となっています。国重要文化財に指定されており、本計画の長寿命化の概念とは異なることから、本計画とは別に国と協議し保存に努めます。			
98	旧渡辺家住宅	継続	保存		適正な維持管理により保存		
				諏訪高島藩に仕えた在郷の村に住む中下級武士の家で、全国的にも貴重とされています。これを後世に伝えるため、平成3年より一般公開し保存・活用しています。解体復元修理の際に、襖の下貼から3,000枚を超す江戸時代の手紙や絵等の文書が発見され、当時を知る貴重な資料となっています。長野県宝に指定されており、本計画の長寿命化の概念とは異なることから、本計画とは別に国および長野県と協議し保存に努めます。			
99	旧山一林組製糸事務所	継続	保存		適正な維持管理により保存		
				大正10年建築の山一林組製糸の事務所で、昭和2年(1927年)に起きた「山一争議」の歴史的舞台となりました。平成17年(2005年)に隣接する守衛所とともに国登録有形文化財になり、平成19年(2007年)には近代化産業遺産群にも認定されており、本計画の長寿命化の概念とは異なることから、本計画とは別に国と協議し保存に努めます。			

### 1 3. その他の施設

#### (1) 施設別状況および評価

No.	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	1次 評価 結果	建物品質平均 (ハード) 偏差値	利用・運営平均 (ソフト) 偏差値
100	中央町三丁目敷地	410.86	S造 他	昭和56年	43	Ⅱ	46.4	58.8
101	内山霊園(管理棟/合葬式墓地)	244.77	W造	昭和48年	51	Ⅱ	46.9	58.0
102	塩嶺倉庫	265.32	S造	平成18年	18	I	59.2	58.0
103	温泉スタンド、給湯施設	23.64	S造 他	令和3年	3	I	72.8	57.9
104	岡谷市看護専門学校	2,908.13	RC造	昭和47年	52	Ⅳ	45.7	30.5
105	旧東堀保育園園舎(除却)	-	-	-	-	-	-	-
106	川岸駅前公衆トイレ	19.48	RC造	平成16年	22	I	66.3	-
107	防災倉庫(中央町一丁目)	191.91	S造	令和3年	8	Ⅳ	71.8	57.9

#### (2) 施設の主な役割と現状・課題

##### 【中央町三丁目敷地】

本市の公共事業等の代替用地として利用するため、平成2年(1990年)に岡谷市土地開発公社が先行取得を行いました。国による「土地開発公社の抜本的改革指針」に基づき公社の債務整理を行った結果、平成25年(2013年)に本市の市有財産(普通財産)となりました。

先行取得当初から存在している店舗棟、住宅棟、倉庫については、現在は老朽化が進行しているものの、行政目的のない普通財産の有効活用という観点から、必要最小限の修繕を施しながら、暫定的に貸店舗や貸事務所、貸住宅等の賃貸物件として貸付を行っています。

##### 【内山霊園(管理棟/合葬式墓地)】

八ヶ岳連峰や市内を望む高台にあり、空の碧さと周囲の緑がほどよく調和する自然に囲まれた墓地です。昭和45年(1970年)開設当初の区画数は610区画でしたが、市民の墓地需要に応え順次造成を行い、現在では2,812区画を備えています。また、平成29年(2017年)7月に合葬式墓地「嶺風苑」を開設し、令和4年(2022年)に増築しました。

##### 【塩嶺倉庫】

大川調整池の建設に伴い岡谷市が所有していた間下倉庫を県に売却したため、代替施設として建設されました。

第一倉庫には太鼓祭に使用する資材、道具、おみこし等、第二倉庫にはグレーチングや甲蓋、杭などの土木用資材、第三倉庫にはチェーンソーなどの工具が保管されています。

### 【温泉スタンド・給湯施設】

本市の温泉事業は、源泉を掘り当てた市民から権利を譲り受け、平成元年（1989年）に開始しました。自宅で温泉を楽しみたいとの市民の要望にも耳を傾け、平成2年（1990年）に「岡谷温泉」として温泉スタンドを開設し、令和3年（2021年）に諏訪湖サイクリングロードの整備に伴い移転しました。

施設への給湯は、温泉スタンドをはじめ、おかや総合福祉センターやロマネット、体育館などの公共施設のほかに民間の福祉施設を含めた5施設へ行っており、温泉の恩恵は広く市民に普及しています。

### 【看護専門学校】

平成23年度（2011年度）に長野県からの設置要請を受け、中南信地域の准看護師が看護師資格を得るための看護師養成校として平成26年（2014年）4月に開校しました。令和5年度は15名、令和6年度は22名が卒業し、卒業後は県内の中南信地区を中心とした医療機関に就職し、地域医療を支える看護師として歩み出しています。

全国的にも、また、県内においても看護師不足が問題となっており、准看護師から看護師資格を得ることができる本校の役割は大きいものと考えます。

県内唯一の全日制2年課程看護師養成校として、質の高い看護教育を行い、地域医療に貢献する看護師の養成に努めます。

昭和47年（1972年）に旧健康保険岡谷塩嶺病院として建築されて以降老朽化が進行しています。

### 【旧東堀保育園園舎】

昭和42年（1967年）から平成30年（2018年）3月まで旧東堀保育園として運営されました。保育園整備計画に基づく更新に伴い、運営を民間に移管し保育園機能は廃止されましたが、西堀保育園の更新の際には、仮園舎として活用されました。土地、建物については令和5年（2023年）10月に建物を除却し、令和6年（2024年）3月に土地を売却処分しました。

### 【川岸駅前公衆トイレ】

男女別のほか多機能を備えた公衆トイレとして、駅利用者をはじめ地域住民などに利用されています。平成16年（2004年）に建築しており、老朽化が進行していることから、計画的な改修を行っております。

### 【防災倉庫（中央町一丁目）】

本市の拠点となる防災倉庫として、市の中心に位置し、緊急輸送道路である県道岡谷茅野線に面しており、また、防災機能を有した公共空地として位置付けされているイルフプラザ平面駐車場に隣接していることから、災害時対応における一体的な活用ができる最適な場所として令和3年（2021年）に設置しました。

また、本倉庫には、災害時及び避難所開設時の初期対応に必要な防災資機材等を計画的に備蓄し、今後の災害に備えています。

### (3) 施設の具体的な方向性・対策の内容等

#### ①公共施設等総合管理計画における長期的方針

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
100	中央町三丁目敷地	継続	継続				
	取得当初から存在している店舗棟、住宅棟、倉庫については、老朽化が進行しているものの、行政目的のない普通財産の有効活用という観点から、必要最小限の修繕を施しながら、暫定的に貸店舗や貸事務所、貸住宅等の賃貸物件として貸付を行います。						
101	内山霊園 (管理棟/合葬式墓地)	継続	継続	最適化工事 実施 60,300	中規模改修 6,000		更新検討
	ハケ岳連峰や市内を望む高台にあり、空の碧さと周囲の緑がほどよく調和する自然に囲まれた墓地です。昭和45年(1970年)開し、市民の墓地需要に応えながら順次造成を行っています。管理棟は木造建物であり、昭和48年の建築から老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。						
102	塩嶺倉庫	継続	継続		中規模改修 5,000		大規模改修 10,000
	塩嶺倉庫は、大川調整池の建設に伴い岡谷市が所有していた間下倉庫を県に売却したため、代替施設として建設されました。平成18年の建築であり建物の状況は良好であることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。						
103	温泉スタンド 給湯施設	継続 (移転)	除却	移転 R3.12.3 廃止・移転			
	温泉施設等への給湯のほか、自宅で温泉を楽しみたいとの市民の要望により、平成2年から温泉スタンドを開設しています。また、給湯施設からは温泉スタンドを含め、5施設への給湯を行っています。諏訪湖周サイクリングロード整備事業に伴い機能移転を行います。移転場所および施設規模については今後検討を行います。						
	温泉スタンド 給湯施設	継続	継続	規模縮小・移転			
				実施 66,000			
				R3.12.3 供用開始			
【検討結果】 諏訪湖周サイクリングロード整備事業で温泉スタンドが支障になることに伴い、温泉スタンドの規模を縮小して諏訪湖ハイツ東側市有地に移設した。移設工事は、令和3年12月1日に竣工し、12月3日から供用開始しました。							
104	看護専門学校	継続	継続		中規模改修 89,000		更新検討
	平成23年(2011年)に長野県からの設置要請を受け、中南信地域の准看護師が看護師資格を得るための看護師養成校として平成26年(2014年)4月に開校しました。旧健康保険岡谷塩嶺病院時代を含め、建物躯体は昭和47年に建築しており老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い長寿命化を図ります。						
105	旧東堀保育園園舎	検討	検討	方向性検討・決定			
	平成30年(2018年)3月まで旧東堀保育園として運営されていましたが保育園整備計画に基づく更新に伴い、運営を民間に移管し保育園機能は廃止されました。建物の利活用について、除却解体を含め検討し、第1期計画期間において、今後の方向性を決定します。						
	旧東堀保育園園舎		除却				
【検討結果】 令和5年10月に建物を除却し、令和6年3月に土地を民間事業者へ売却しました。							

No.	施設名称	二次評価 (長期的方針)		スケジュール(上段:改修種別・下段:改修費用(千円))			
		機能	施設	第1期	第2期	第3期	第4期
106	川岸駅前公衆トイレ	継続	継続	中規模改修			
				実施 4,600			
				多機能を備えた公衆トイレとして、川岸駅利用者はじめ地域住民に利用されています。平成16年に建築しており老朽化が進行していることから、適切な維持管理および計画的な改修を行い、長寿命化を図ります。			
107	防災倉庫(中央町一丁目)	継続	継続				
				災害時には一体的な活用ができる最適な場所として市内中心部に設置されており、災害への備えとして防災資機材等を備蓄するほか、適切な維持管理により施設の長寿命化を図ります。			

## ②第2期計画における各施設の方針

No.	施設名称	第2期計画期間 の方向性		スケジュール(上段:改修種別・中段:修繕費用(千円)・下段:施設調査)									
		機能	施設	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
100	中央町三丁目敷地	継続	継続										
									劣化度調査				
101	内山霊園 (管理棟/合葬式墓地)	継続	継続								中規模修繕		
									劣化度調査		6,000		
102	塩嶺倉庫	継続	継続								中規模修繕		
									劣化度調査		5,000		
103	温泉スタンド 給湯施設	継続	継続										
									劣化度調査				
104	看護専門学校	継続	継続							中規模修繕			
										89,000			
105	旧東堀保育園園舎	—	—										
106	川岸駅前公衆トイレ	継続	継続										
									劣化度調査				
107	防災倉庫(中央町一丁目)	継続	継続										
									劣化度調査				

## 第7章 計画推進に向けた取組体制

### 1 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制・手法

公共施設の統廃合等、施設の再編などによる市民サービスの向上は、全体の最適化に資するものであることから、公共施設の最適化や多機能化等の取組みについて、施設担当課および公共施設マネジメントの専任部局である企画政策部行政管理課が協力して議論・検討の推進を図ります。


本計画の基本方針に基づき適正な施設管理に取り組む過程においては、経営的な視点から財産の保有・処分・維持管理等の総合的なマネジメントである「ファシリティマネジメント」の考え方を導入し、資産総量の適正化や長寿命化の推進のみならず、施設の効率的な管理運営を図るため、開館時間、営業日および施設使用料等の見直しや、利用状況に応じた使用形態の見直しなどを行います。

### 2 フォローアップの実施方針

今後、公共施設等総合管理計画の方針や本計画における各施設の方向性に基づき、個別施設ごとに具体的な取り組みを行います。事務的な整理や整備手法などの検討や具体的な対策の実施にあたっては、対象施設に関連する市民・施設利用者・関係団体等との協議を行い、十分な調整と合意形成を図りながら進めます。

また、長寿命化や複合施設化、予防・維持保全の推進を行う施設については、それぞれ改修計画を策定し、実際の事業実施に際しては、財政状況との整合性を図り財政負担の平準化を行います。

なお、対策方針が「継続」となっている施設についても、建物の残寿命が短いものや社会情勢や市民ニーズの変化により施設のあり方を考慮するものについては、第1期以内での見直しや、第2期以降の計画策定時において対策(方向性)を検討します。

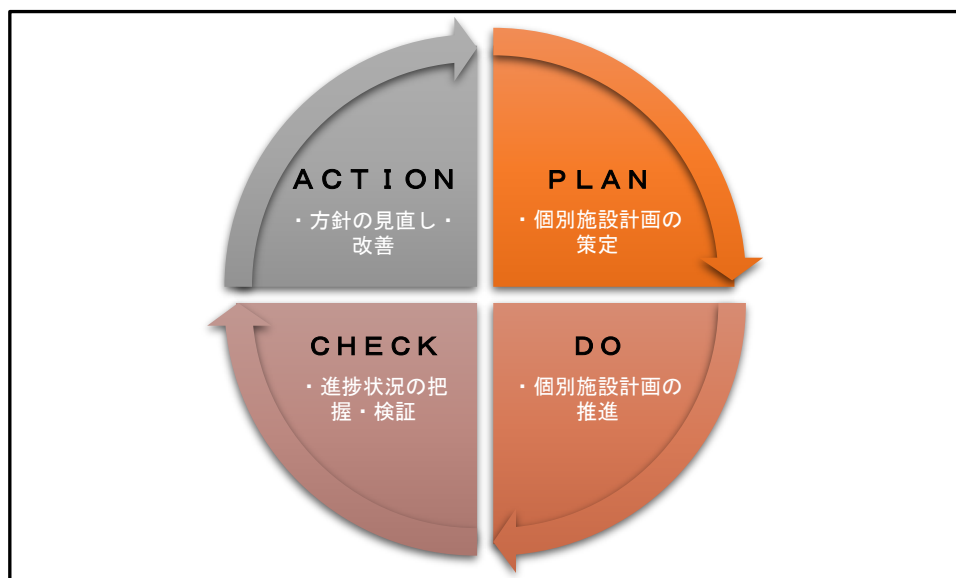



### 3 市民等との協働

市民の皆さんにとって、身近な公共施設等の今後の方針については、非常に関心の高い重要な問題であり、市議会をはじめ市民の皆さんの理解と協力は必要不可欠であります。公共施設等の理解を深めるため、情報提供に努め、市全体で認識の共有を図りながら本計画を推進します。

## 第2期岡谷市公共施設個別施設計画

発行日 2026年 月

発行 岡谷市

編集 企画政策部 企画課  
長野県岡谷市幸町8番1号

TEL 0266-23-4811 (代表)

FAX 0266-24-0689

e-mail [kikaku@city.okaya.lg.jp](mailto:kikaku@city.okaya.lg.jp)
