


# 岡谷市川岸学園整備基本計画【概要版】

川岸学園設立準備室  
令和6年2月

## 川岸学園整備基本計画策定にあつて

「川岸学園構想」に基づき、川岸小学校と岡谷西部中学校を接続し、施設一体型の義務教育学校への移行を図るとともに、「岡谷市保育園整備計画中期計画」で方針決定した校地内に公立幼保連携型認定こども園の併設による幼児期から義務教育期までが切れ目なくつながる新たな環境づくりの推進に向け、施設整備等に関わる基本的な方針について、「川岸学園整備基本計画」としてまとめました。

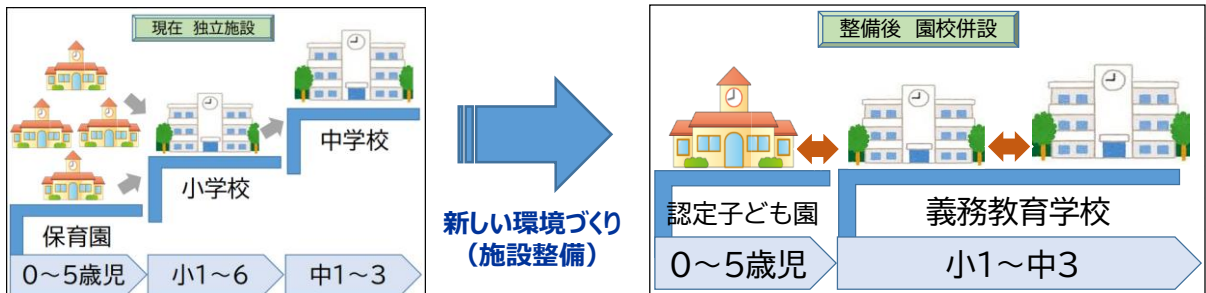

＜本計画が目指す施設整備の姿＞

## 校舎・園舎整備の基本方針

### 学校施設（川岸小学校、岡谷西部中学校）

- ◆川岸小学校については、**既存教室棟の長寿命化大規模改修**を基本とします。
- ◆利用教室の再編等により、学校施設の総量の抑制を図り、**減築を実施**します。
- ◆**小中学校間を渡り廊下で接続**し、施設一体型義務教育学校の施設条件を満たす環境を整えます。
- ◆**小中学校の共同給食調理室**と園校間連携のための**地域交流スペース**を新たに整備する。
- ◆学童クラブは整備後の校舎に移設し、専用玄関と駐車場の整備を行う。
- ◆併設の認定こども園と建物をつなぎ、給食搬送用ダムウェーダーを兼ねた**共用エレベータ**を整備する。
- ◆昇降口前等の外構は、学校関係者用に駐車場を確保し、安全な利用に配慮した環境を整備する。


### 保育等施設（認定こども園）

- ◆既存校舎（教室棟西）を解体し、跡地に**新園舎を新築**します。
- ◆川岸保育園の「子育て支援センター（ぱんだぐみ）」を**移設**するほか、**一時保育室を配置**します。
- ◆園舎内に**こども園専用の給食調理室**を整備します。
- ◆**新園舎は2階建**とし、バリアフリー対応や給食搬送のため、学校と共用のエレベータを整備します。
- ◆園庭は校庭の使用に支障がないよう約1000㎡程度確保し、一部芝生化を検討します。
- ◆保護者送迎用駐車場は、登下校する児童の動線や安全に配慮し、約30台分を確保します。

## 施設配置計画の想定

施設配置計画（案）として、**新設となるこども園は小学校建物と校庭間に配置し**、現小学校の校庭利用に支障のないように園庭を配置します。【ピンク色】小中学校間を接続する渡り廊下を設け、小中学校共同の給食調理室と世代間交流等を行いやすい多目的室等の設置を検討します。

なお、**渡り廊下の接続位置は山側に配置することを基本**に検討します。

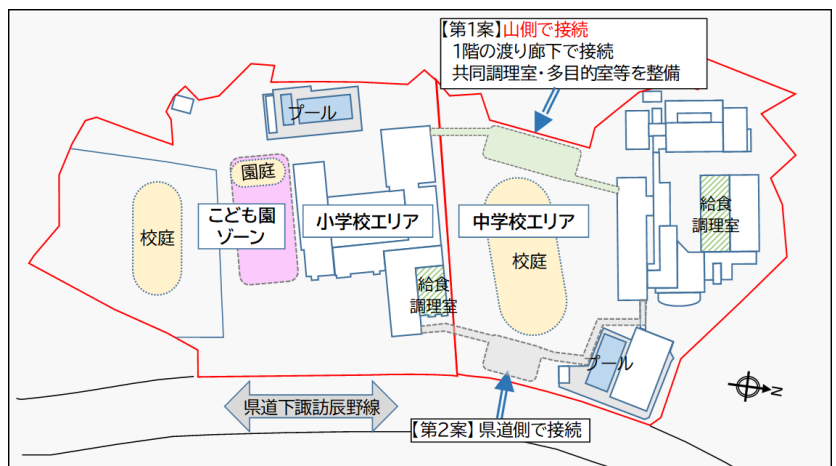

# 各諸室の配置想定

## (義務教育学校)


長寿化大規模改修による施設整備と校舎の減築に合わせ、学校運営に必要な教室数を確保し、集約化を図り、配置の効率性を高める計画とします。

## (認定こども園)

既存の園舎を参考に、新園舎で想定している建物面積、見込まれるクラス数、諸室等を踏まえ、施設基準を満たした2階建ての建物として、仮に配置したイメージになります。(右図)

義務教育学校も認定こども園も実際の建物や配置について、今後の設計作業の中で詳細を決定していきます。

＜新園舎の配置想定（イメージ図）＞

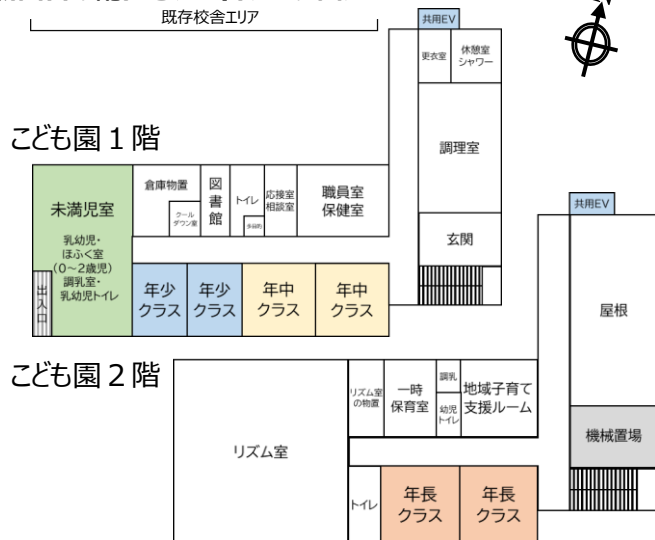

## 概算事業費の想定

全体の事業費は国土交通省が示す最新の建築単価及び市内公共施設の同種の整備実績等を参考に、現時点における目安として、右記のとおり、目標額を設定します。

ただし、建築資材の高騰等の不確定要素があるため、今後変動する可能性があります。

| 施設の種類    | 目標とする事業費 | 備考         |
|----------|----------|------------|
| 学校施設整備   | 約30億円以内  | 設計料、仮設費等含む |
| 認定こども園整備 | 約7億円以内   | 新築整備一式     |

## 事業スケジュール（目安）について

義務教育学校の開校、こども園の開園時期は、現時点における見込みとして、令和9(2027)年4月をめざすこととし、令和6年度は測量等の調査業務及び設計業務に着手します。

| 工事内容                      | R6(2024) | R7(2025) | R8(2026) | R9(2027) |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 各種調査<br>(測量・ボーリング調査等)     | 調査       |          |          |          |
| 設計業務<br>(基本設計・実施設計)       | 設計       |          |          |          |
| 学校施設整備<br>仮設校舎建設・既存校舎一部解体 |          | 仮設・解体    |          | 解体       |
| 既存校舎大規模改修・解体工事            |          | 契約事務     | 校舎大規模改修  | 開校・開園    |
| 小中接続施設建設工事                |          |          | 接続施設建設   |          |
| こども園整備<br>新園舎建設工事         |          |          | 園舎建設     |          |
| 外構工事<br>整地、排水、駐車場整備等      |          |          |          | 外構工事     |

## 今後の進め方

令和6年度より開校、開園に向けた運営計画等の策定を進めるため、関係者等で構成する設立準備委員会と専門部会等を設け、個別に検討を進めます。なお、川岸学園としている名称は開校までに決定します。

| (仮称)川岸学園設立準備委員会    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 学校運営計画等検討部会      | 教育方針、学校ランドデザインの樹立、カリキュラム、学校運営計画等の検討  |
| 2 学校生活検討部会         | 校歌、校章、制服、体操服、学用品等の検討                 |
| 3 地域コミュニティ・PTA検討部会 | 地域参画の新コミュニティ・スクールの検討、新校のPTA組織、活動等の検討 |
| 4 総務部会             | 小中交流等開校準備活動の検討、開校に向けた式典等の検討          |
| 5 施設整備部会           | 施設整備に伴う引っ越し等の調整、諸室移設等の検討             |
| 6 こども園部会(子ども課所管)   | 開園までの交流活動、引っ越し等の調整                   |
